




# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali

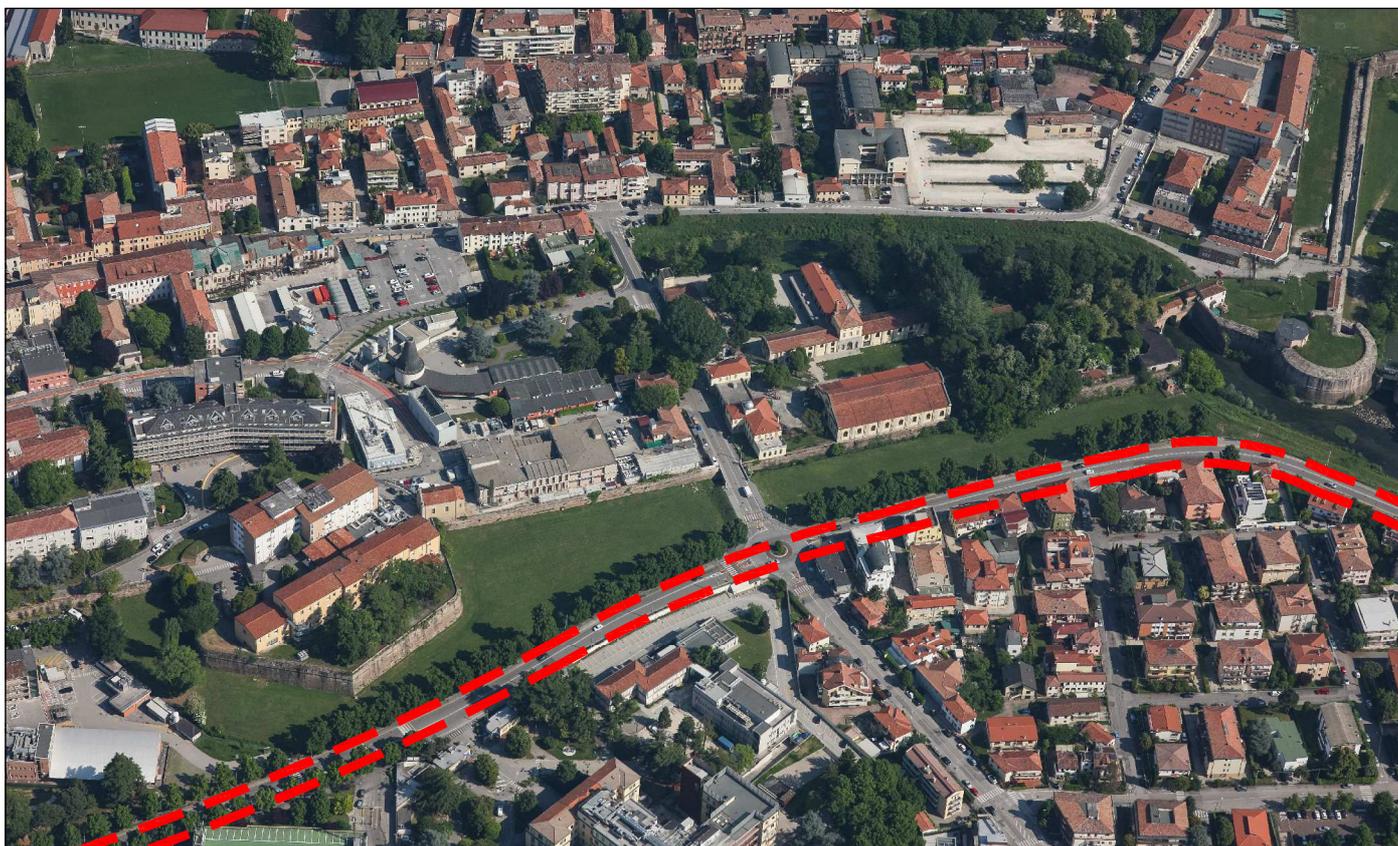

## BICIPOLITANA PATAVINA ITINERARIO CICLABILE DI VIA GATTAMELATA

N° Progetto  
004

nome file  
Gattamelata.dwg

aprile 2021

LLPP  
OPI 2021\_004

Elaborato

**H**

CRONOPROGRAMMA

**Progettisti**

arch. Alberto Marescotti  
geom. Daniele Pettenello  
geom. Alessandra Agosti

**Rup**

ing. Massimo Benvenuti

**Capo Servizio**

ing. Massimo Benvenuti

**Capo Settore**

ing. Emanuele Nichele

PROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei lavori - giorni (5)

	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180				
Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est Percorso ciclopedonale																																									
installazione servizi per il cantiere (baraccamento, aree di stoccaggio, ecc.)			2	2																																					
allestimento area di cantiere (recinzioni, barriere, ecc. sull'area di lavorazione)					3	3																																			
demolizioni: rimozione di cordonate stradali						2	2	2	3	3	3																														
demolizioni: scarifica della pavimentazione stradale													3	2	2																										
scavi per servizi: acqua, gas, illuminazione, rete fognaria															3																										
movimento di materie: scavi di sbancamento/scarifica/taglio																3	3	3	3	2	2	2	2	3																	
sovrastuttura stradale: posa tessuto non tessuto, frantumato di cava, fondazione, binder, e manto																								2	2																
posa di cordonate stradali																											2	2	2	2	2	2									
impianto di pubblica illuminazione																																						2			
posa di pavimentazione pedonale																																						2	2		
pavimentazione manto d'usura																																						2			
opere del verde: inerbimento e posa nuove alberature																																						2			
segnaletica stradale: orizzontale, verticale e complementare																																							2		
smontaggio del cantiere e dei servizi																																								1	

giorni	settimane	U/Giorno medio per tipo di lavorazione	U/Giorni per tipo di lavorazione
2	2	2	8
2	2	1	4
1	9	2	15
4	4	1	16
2	2	2	8
2	16	1	46
2	6	1	8
2	12	1	24
1	3	1	3
2	5	1	8
1	4	1	4
1	4	1	4
1	1	1	1
1	1	1	1

PRESENZE SETTIMANALI	0	0	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1				
PRESENZE MENSILI							14							16							17							15							12							13

totale presenze	totale uomini giorno - medie per lavorazione	totale uomini/giorno
87	17	150
