9hstudio

Nome	Data d'inizio	Data di fine
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA GIROTONDO CON DEMOLIZIONE ESISTEN...	31/01/22	28/11/22
PUNTI DI VERIFICA	31/01/22	29/09/22
Consegna lavori	31/01/22	31/01/22
Inizio opere strutturali	10/02/22	10/02/22
Fine lavori strutturali	01/06/22	01/06/22
Edificio coperto	23/06/22	23/06/22
Edificio chiuso	30/09/22	30/09/22
CAMPIONATURE STRATEGICHE DATE LIMITE APPROVAZIONE	19/04/22	05/09/22
copertura e coibentazioni	19/04/22	19/04/22
Materiali impianti meccanici	01/06/22	01/06/22
Materiali impianti elettrici	11/07/22	11/07/22
Serramenti	14/07/22	14/07/22
Pavimenti e rivestimenti	18/07/22	18/07/22
Materiali sistemazioni esterne	06/09/22	06/09/22
CANTIERIZZAZIONE E APPRESTAMENTI	31/01/22	28/11/22
Recinzione cantiere	31/01/22	01/02/22
Allestimento cantiere	02/02/22	03/02/22
Gru di cantiere	31/01/22	21/06/22
PONTEGGI EDILI	01/04/22	24/06/22
Ponteggi esterni edili- montaggio	01/04/22	04/04/22
Ponteggi esterni edili - smontaggio	23/06/22	24/06/22
PONTEGGI DA PITTORE	19/08/22	19/09/22
Ponteggi da pittore montaggio	19/08/22	22/08/22
Ponteggi da pittore smontaggio	16/09/22	19/09/22
Pulizie finali e smobilizzo	25/11/22	28/11/22
LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE	04/02/22	24/11/22
DEMOLIZIONI	04/02/22	09/02/22
Demolizioni	04/02/22	04/02/22
Altro	07/02/22	07/02/22
Altro	08/02/22	08/02/22
Altro	09/02/22	09/02/22
OPERE STRUTTURALI	10/02/22	31/05/22
FONDAZIONI	10/02/22	18/03/22
Scavi	10/02/22	15/02/22
Magrone di fondazione	16/02/22	16/02/22
Armo e getto Primo batolo	17/02/22	02/03/22
Armo e getto colli di fondazione	03/03/22	09/03/22
Getto cappa vespaio	17/03/22	18/03/22
ELEVAZIONI: PRIMO LIVELLO	21/03/22	31/05/22
Rinterro esterno in materiale arido	21/03/22	22/03/22
Elevazioni - murature blocco cassero	25/03/22	14/04/22
Solaio di copertura - armo e getto predalles	15/04/22	29/04/22
Solaio copertura armo corona solaio interno	02/05/22	13/05/22
Solaio copertura: posa orditura metallica e lignea	16/05/22	19/05/22
Solaio copertura: soletta collaborante	20/05/22	20/05/22
Solaio copertura: strutture shed	23/05/22	27/05/22
Solaio copertura: getto cappa collaborante	30/05/22	31/05/22
ELEVAZIONI: SECONDO LIVELLO	02/05/22	06/05/22
Murature in blocco cassero	02/05/22	04/05/22
armo e getto predalles	05/05/22	06/05/22
Copia_Copia_Altro	23/05/22	23/05/22
OPERE EDILI	10/03/22	24/11/22
Vespaio Ventilato	10/03/22	16/03/22
getto marciapiedi esterni e portici	23/03/22	24/03/22
Manto di copertura e opere da lattoniere	01/06/22	22/06/22
Serramenti controatelai	23/06/22	24/06/22
Divisori interni: struttura	23/06/22	29/06/22
Assistenze murarie e ripristini	28/06/22	04/07/22
Intonaci e complementi	07/07/22	20/07/22
Isolamenti a pavimento	21/07/22	25/07/22
massetti interni	02/08/22	05/08/22
Controsoffitti e cartongessi	08/08/22	29/08/22
Pavimenti e rivestimenti piastrelle	30/08/22	07/09/22
Serramenti esterni	16/09/22	29/09/22
Opere da pittore interne	08/09/22	19/10/22
Pavimento resiliente	20/10/22	03/11/22
Serramenti interni	04/11/22	10/11/22
Opere varie di completamento interno	11/11/22	17/11/22
Collaudi finali	18/11/22	24/11/22
Opere fognarie - scavi e rinterrri	23/06/22	06/07/22
Cappotto esterno - prima fase	19/08/22	15/09/22
Massetti esterni	20/09/22	26/09/22
Pavimenti esterni	27/09/22	10/10/22
Cappotto esterno - completamento	11/10/22	17/10/22
Sistemazioni esterne varie	18/10/22	24/10/22
Recinzioni - opere da fabbro	25/10/22	27/10/22
Altro	25/10/22	25/10/22
IMPIANTI MECCANICI	10/03/22	21/10/22
Scarichi e dorsali in vespaio e colonne sfiato	10/03/22	16/03/22
Sfiati verticali	21/03/22	22/03/22
stesa dorsali a sffitto e collettori pavimento	23/06/22	06/07/22
adduzioni dorsali meccaniche in esterno	23/06/22	29/06/22
Stesa impianto radiante	26/07/22	01/08/22
Posa canali aeraluci a soffitto	08/08/22	29/08/22
Costruzione centrale termica - pompa di calore	08/09/22	05/10/22
Posa terminali e sanitari	30/09/22	13/10/22
Posa e allacciamento UTA	06/10/22	12/10/22
Opere varie meccaniche	13/10/22	19/10/22
Collaudi in opera	20/10/22	21/10/22
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	10/03/22	24/10/22
Corrugati in vespaio	10/03/22	11/03/22
Posa struttura per fotovoltaico	01/06/22	08/06/22
Posa corrugati in traccia e scatole	23/06/22	06/07/22
adduzioni dorsali elettriche in esterno	23/06/22	29/06/22
Posa canale e cablaggi	08/08/22	29/08/22
Quadri e cablaggio	30/09/22	13/10/22
Terminali elettrici	30/09/22	13/10/22
Corpi illuminanti	30/09/22	13/10/22
Opere varie elettriche	14/10/22	20/10/22
Collaudi in opera	21/10/22	24/10/22
ATTIVITA' TECNICHE	31/01/22	31/01/22
Prove di carico	31/01/22	31/01/22
Relazione strutture ultimate	31/01/22	31/01/22
Acquisizione asbuilt	31/01/22	31/01/22
Attività di collaudo	31/01/22	31/01/22

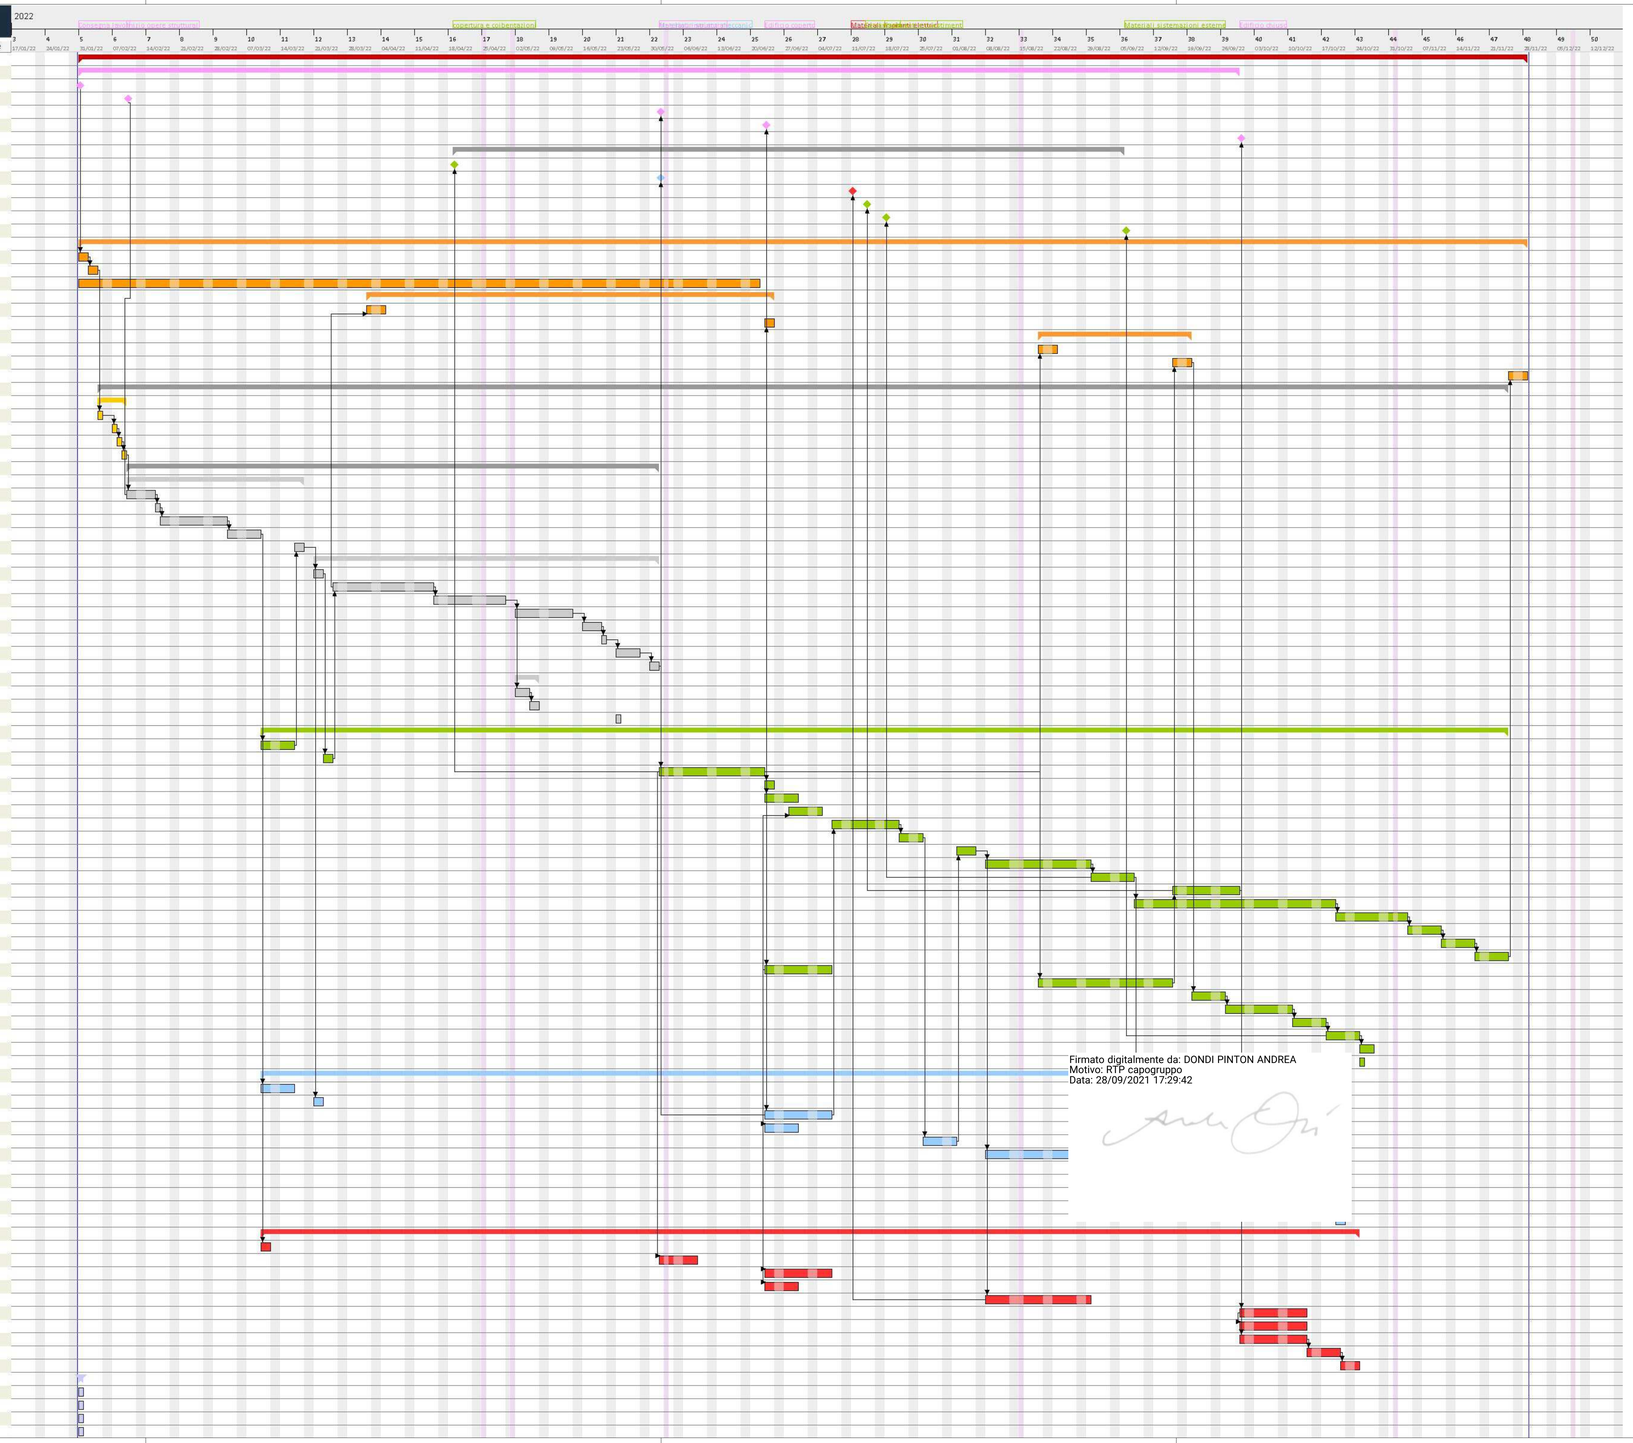

Firmato digitalmente da: DONDI PINTON ANDREA
Motivo: RTP capogruppo
Data: 28/09/2021 17:29:42

CONCEPTIONS

COMUNE DI PADOVA

oggetto

NUOVO PLESSO SCOLASTICO 'GIROTONDO' E DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE

luogo dei lavori

PADOVA

Via Alfredo Melli, 11

RUP

geom. Renato Gallo

CUP: H93H19000190004

CODICE OPERA: LLPP ESP 2020/073

progettisti

RTP: arch. Andrea Dondi Pinton (capogruppo)

progettazione generale

arch. Andrea Dondi Pinton

Via Settima Strada, 7 - 35129 - Padova

049.8766192 - andrea.dondi@9hstudio.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI PADOVA ANDREA DONDI PINTON n° 1450

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

CRP

REV.	DATA	MOTIVO	FASE
00		Emissione	ESE

data prog.	08/2021
tipo elaborato	ESE
ind. prog.	2018
ind. elab.	2018ESE00102CRP
disegnato	Autore
revisionato	ADP
data stampa	15/09/2021 09:25:18

note

A termini di legge il presente elaborato non è riproducibile senza il consenso scritto del Progettista in ogniqrfa.

STUDIO 5 INGEGNERIA
ING. A. GASPARINI

9hstudio
dott. ing. andrea dondi pinton
architetti
via settima strada 7 - 35129 padova - tel 049.8766192 fax 049.8770864
e-mail - dott. ing. andrea dondi@9hstudio.it - andrea.dondi@9hstudio.it

collaboratori

-
