Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

COMUNE DI PADOVA

BENVENUTI MASSIMO COMUNE DI PADOVA 09.02.2023 13:53:16 UTC

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA": CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE

CUP: J55E22000170006

ALBERTO MUFFATO 09.02.2023 12:27:57 GMT+01:00

progettisti incaricati

sinergo

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato
Progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto
Progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto
Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato
Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Gruppo di lavoro
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind. Beppino Bortot
dott. urb. Alessandro Calzavara
arch. Roberto Ervas
ing. Alberto Minato
geol. Giuseppe Negri

DESCRIZIONE ELABORATO	NUM. ELAB.	CODICE DOCUMENTO
Cronoprogramma	14	22076-03_1_PD-DG1.13-03 REL
CODICE OPERA LLPP EDP 2022/068 CUP: H95B22000060006		DATA 22 DICEMBRE 2022
RESPONSABILE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE Arch. Alberto Muffato	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Massimo Benvenuti	IL CAPO SETTORE LL. PP. Ing. Matteo Banfi
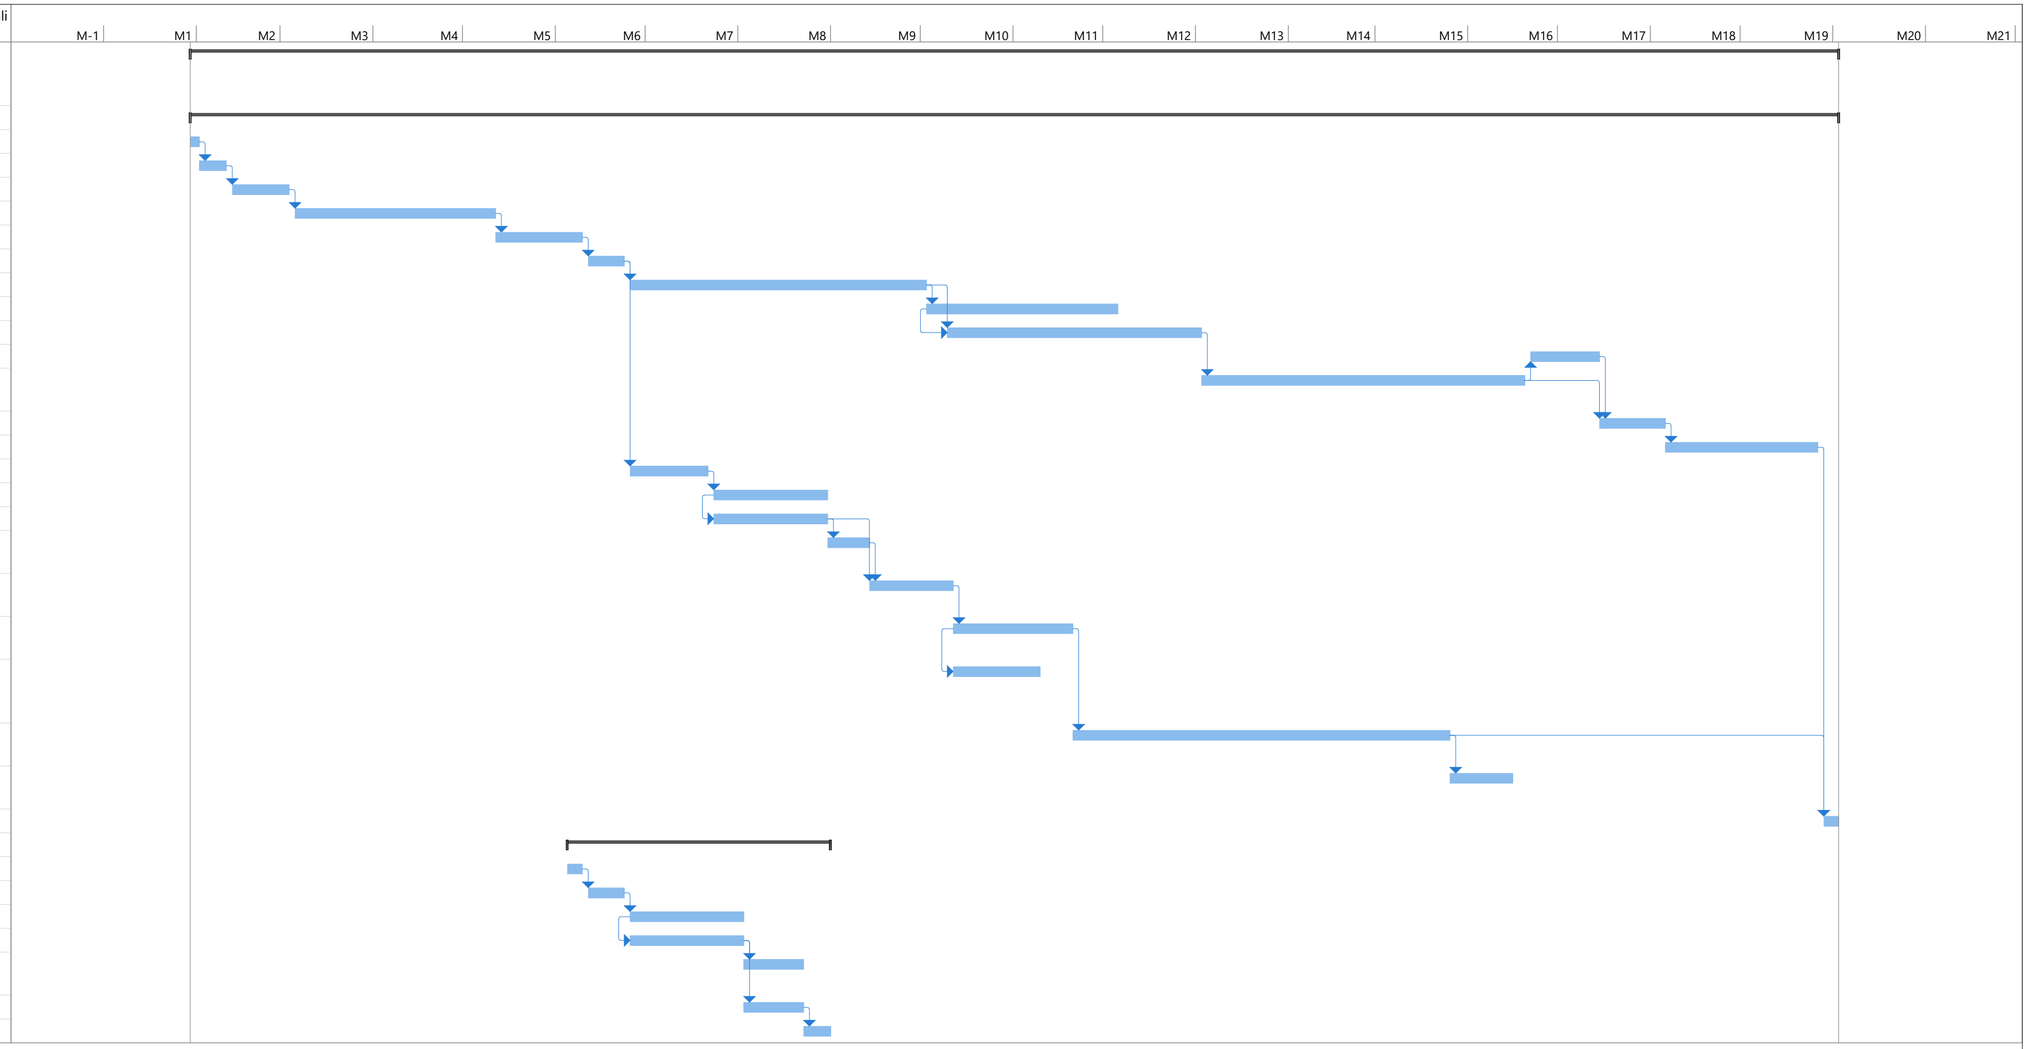
ID	WBS	Nome attività	Giorni Naturali Consecutivi
1	**1**	**Progetto definitivo per la realizzazione della cittadella dello sport "Valsugana"**	**550**
2	**1.1**	**Ambito A**	**550**
3	1.1.1	Installazione Cantiere	3
4	1.1.2	Scavi e movimentazione terrer	9
5	1.1.3	Fondazioni	19
6	1.1.4	Strutture in elevazione/tribune	67
7	1.1.5	Opere di carpenteria metallica	29
8	1.1.6	Copertura e parete inclinata	12
9	1.1.7	Opere edili non strutturali	99
10	1.1.8	Impianto idraulico/sanitario	64
11	1.1.9	Impianto elettrico/audio	85
12	1.1.10	Infissi	23
13	1.1.11	Pavimentazioni e rivestimenti interni	108
14	1.1.12	Tinteggiature	22
15	1.1.13	Opere di finitura	51
16	1.1.14	Scavo area campo da rugby	26
17	1.1.15	Impianto di irrigazione	38
18	1.1.16	Impianto di drenaggio	38
19	1.1.17	Reinterri e riporti sottofondazione campo	14
20	1.1.18	Realizzazione campo in erba naturale	28
21	1.1.19	Opere di invarianza, recupero idrico	40
22	1.1.20	Sottoservizi esterni, allacciamenti e reti di smaltimento acque reflue e	29
23	1.1.21	Percorsi esterni, parcheggio e Pavimentazioni esterne	126
24	1.1.22	Impianto elettrico esterno, cablaggio e punti luce, ecc	21
25	1.1.23	Pulizie e Disallestimento Cantie	5
26	**1.2**	**Ambito B**	**134**
27	1.2.1	Installazione Cantiere	5
28	1.2.2	Scavo	12
29	1.2.3	Impianto di irrigazione	38
30	1.2.4	Impianto di drenaggio	38
31	1.2.5	Rinterri e riporti sottofondazione campo	20
32	1.2.6	Stesura manto in erba sintetica	20
33	1.2.7	Pulizie e Disallestimento Cantie	9
