

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DELLO STADIO EUGANEO CON NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET, NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E NUOVA CURVA FATTORI

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA		DATA
LLPP EDP 2019/163 - 2019/164 - 2019/165		Maggio 2020
DESCRIZIONE ELABORATO		NUMERO
DIAGRAMMA DI GANTT		APPR_171_SIC
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE
Ing. Claudio Rossi	Arch. Stefano Benvegnù	Ing. Emanuele Nichele
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA Studio Muratori & Zanon arch. Giulio Muratori arch. Federico Muratori arch. Nadia Scarabottolo arch. Matteo Martin	PROGETTO STRUTTURALE Arch. Cristian Lazzarin	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI P.I. Antonio Brunello Ing. Aurelio Brunello
	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Sergio Masuzzo	CONSULENZA AUTORIZZAZIONI ENTI Studio Bonsembiante

ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di Padova

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione lato SUD dello Stadio Euganeo con nuovo palazzetto per il basket, nuovo palazzetto polifunzionale e nuova curva Fattori.

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici.

CANTIERE: Via Nereo Rocco, Padova (Padova)

Comune di Padova, 11/05/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Documento firmato da:
BENVEGNÙ STEFANO
COMUNE DI PADOVA
14/05/2020



(Architetto Benvegnù Stefano)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(Responsabile del Procedimento Benvegnù Stefano)


Architetto Benvegnù Stefano


Via N. Tommaseo, 60
35131 Padova (PD)
Tel.: 049-8204301 - Fax: 049-8207108
E-Mail: benvegnus@comune.padova.it


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

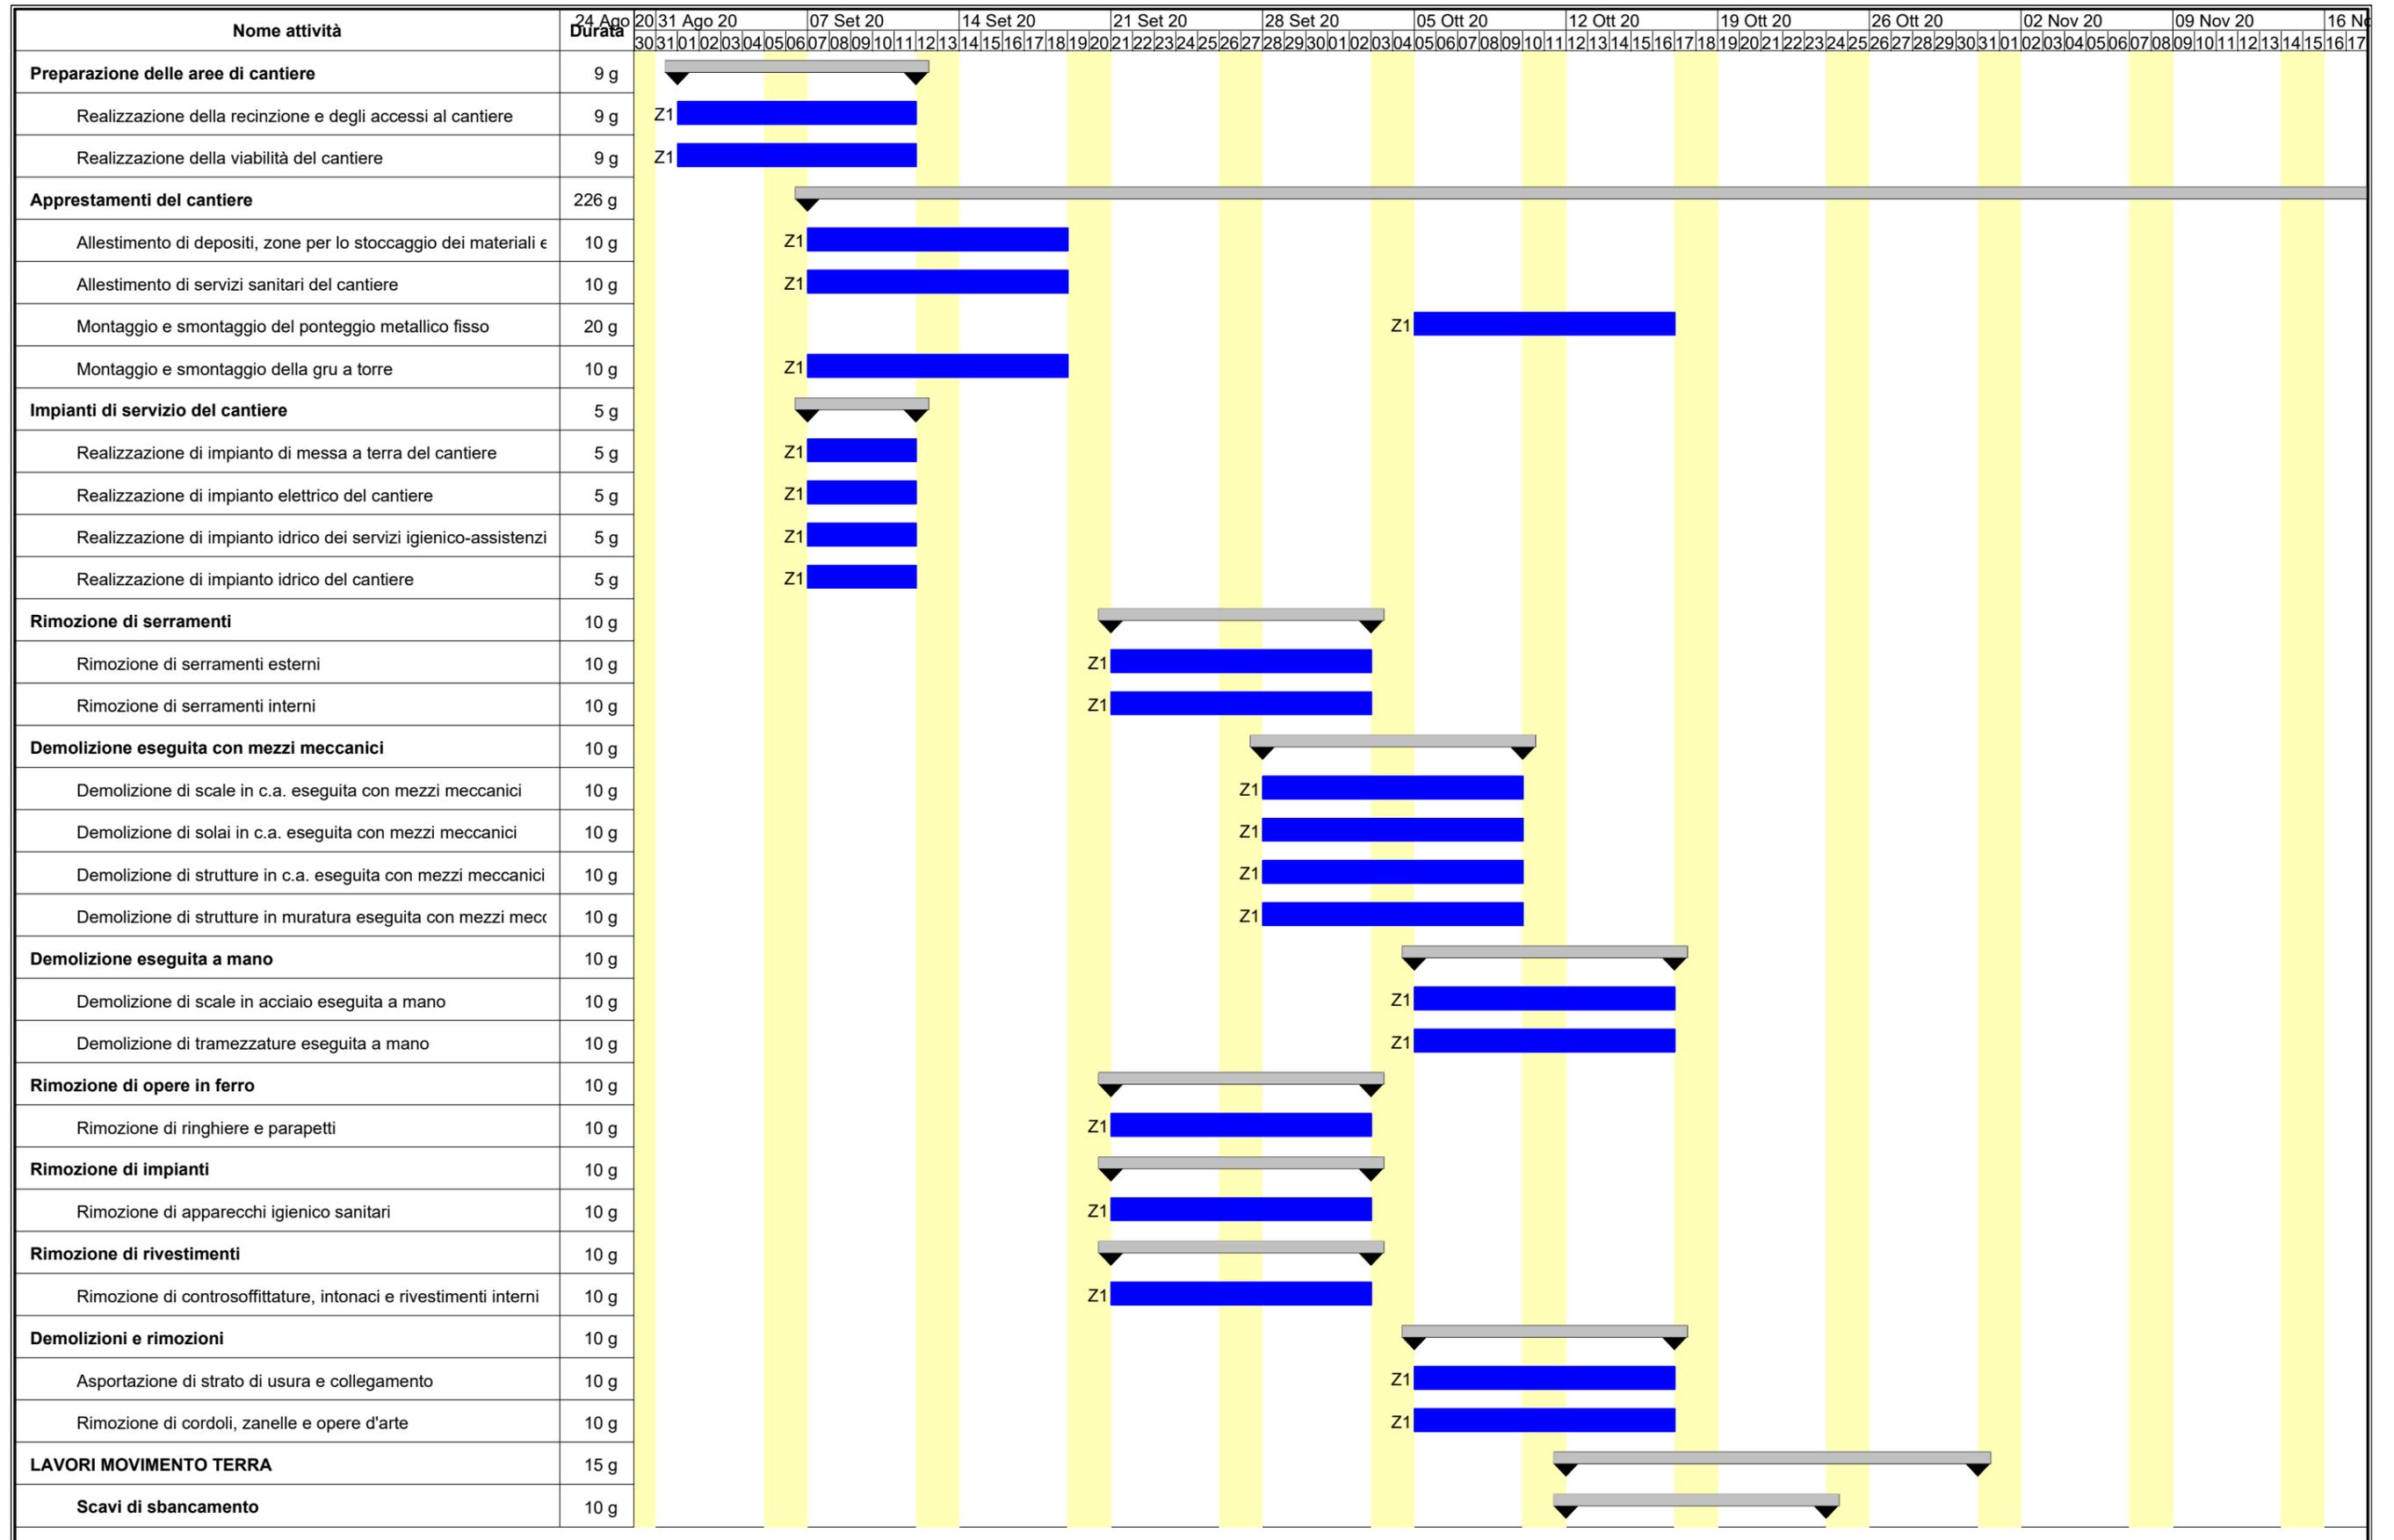


Nome attività	Durata	24 Ago	31 Ago 20	07 Set 20	14 Set 20	21 Set 20	28 Set 20	05 Ott 20	12 Ott 20	19 Ott 20	26 Ott 20	02 Nov 20	09 Nov 20	16 Nov 20						
		30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	10 g																			
Manti di copertura	20 g																			
Montaggio di copertura in Elysium 574 Plus	15 g																			
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	15 g																			
Montaggio di copertura in lastre traslucide	15 g																			
Opere di lattoneria	10 g																			
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g																			
Impermeabilizzazione di coperture	10 g																			
Strutture in elevazione in muratura	20 g																			
Realizzazione di murature in elevazione	20 g																			
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	20 g																			
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in eleva.	20 g																			
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	20 g																			
Isolamenti termici e acustici	19 g																			
Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici v	19 g																			
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	19 g																			
Pareti divisorie, controsoffittature	109 g																			
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	20 g																			
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	20 g																			
Realizzazione di pareti divisorie interne in pannelli sandwich	15 g																			
Posa di divisori in laminato plastico HPL	15 g																			
Compartimentazioni antincendio	20 g																			
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	20 g																			
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	20 g																			
Intonaci e pitturazioni in facciata	25 g																			
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	20 g																			
Tinteggiatura di superfici esterne	15 g																			
Intonaci e pitturazioni interne	29 g																			
Formazione intonaci interni (industrializzati)	19 g																			
Tinteggiatura di superfici interne	19 g																			
Massetti e sottofondi	20 g																			
Formazione di massetto per pavimenti interni	20 g																			
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	15 g																			
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	15 g																			
Pavimentazioni interne	15 g																			

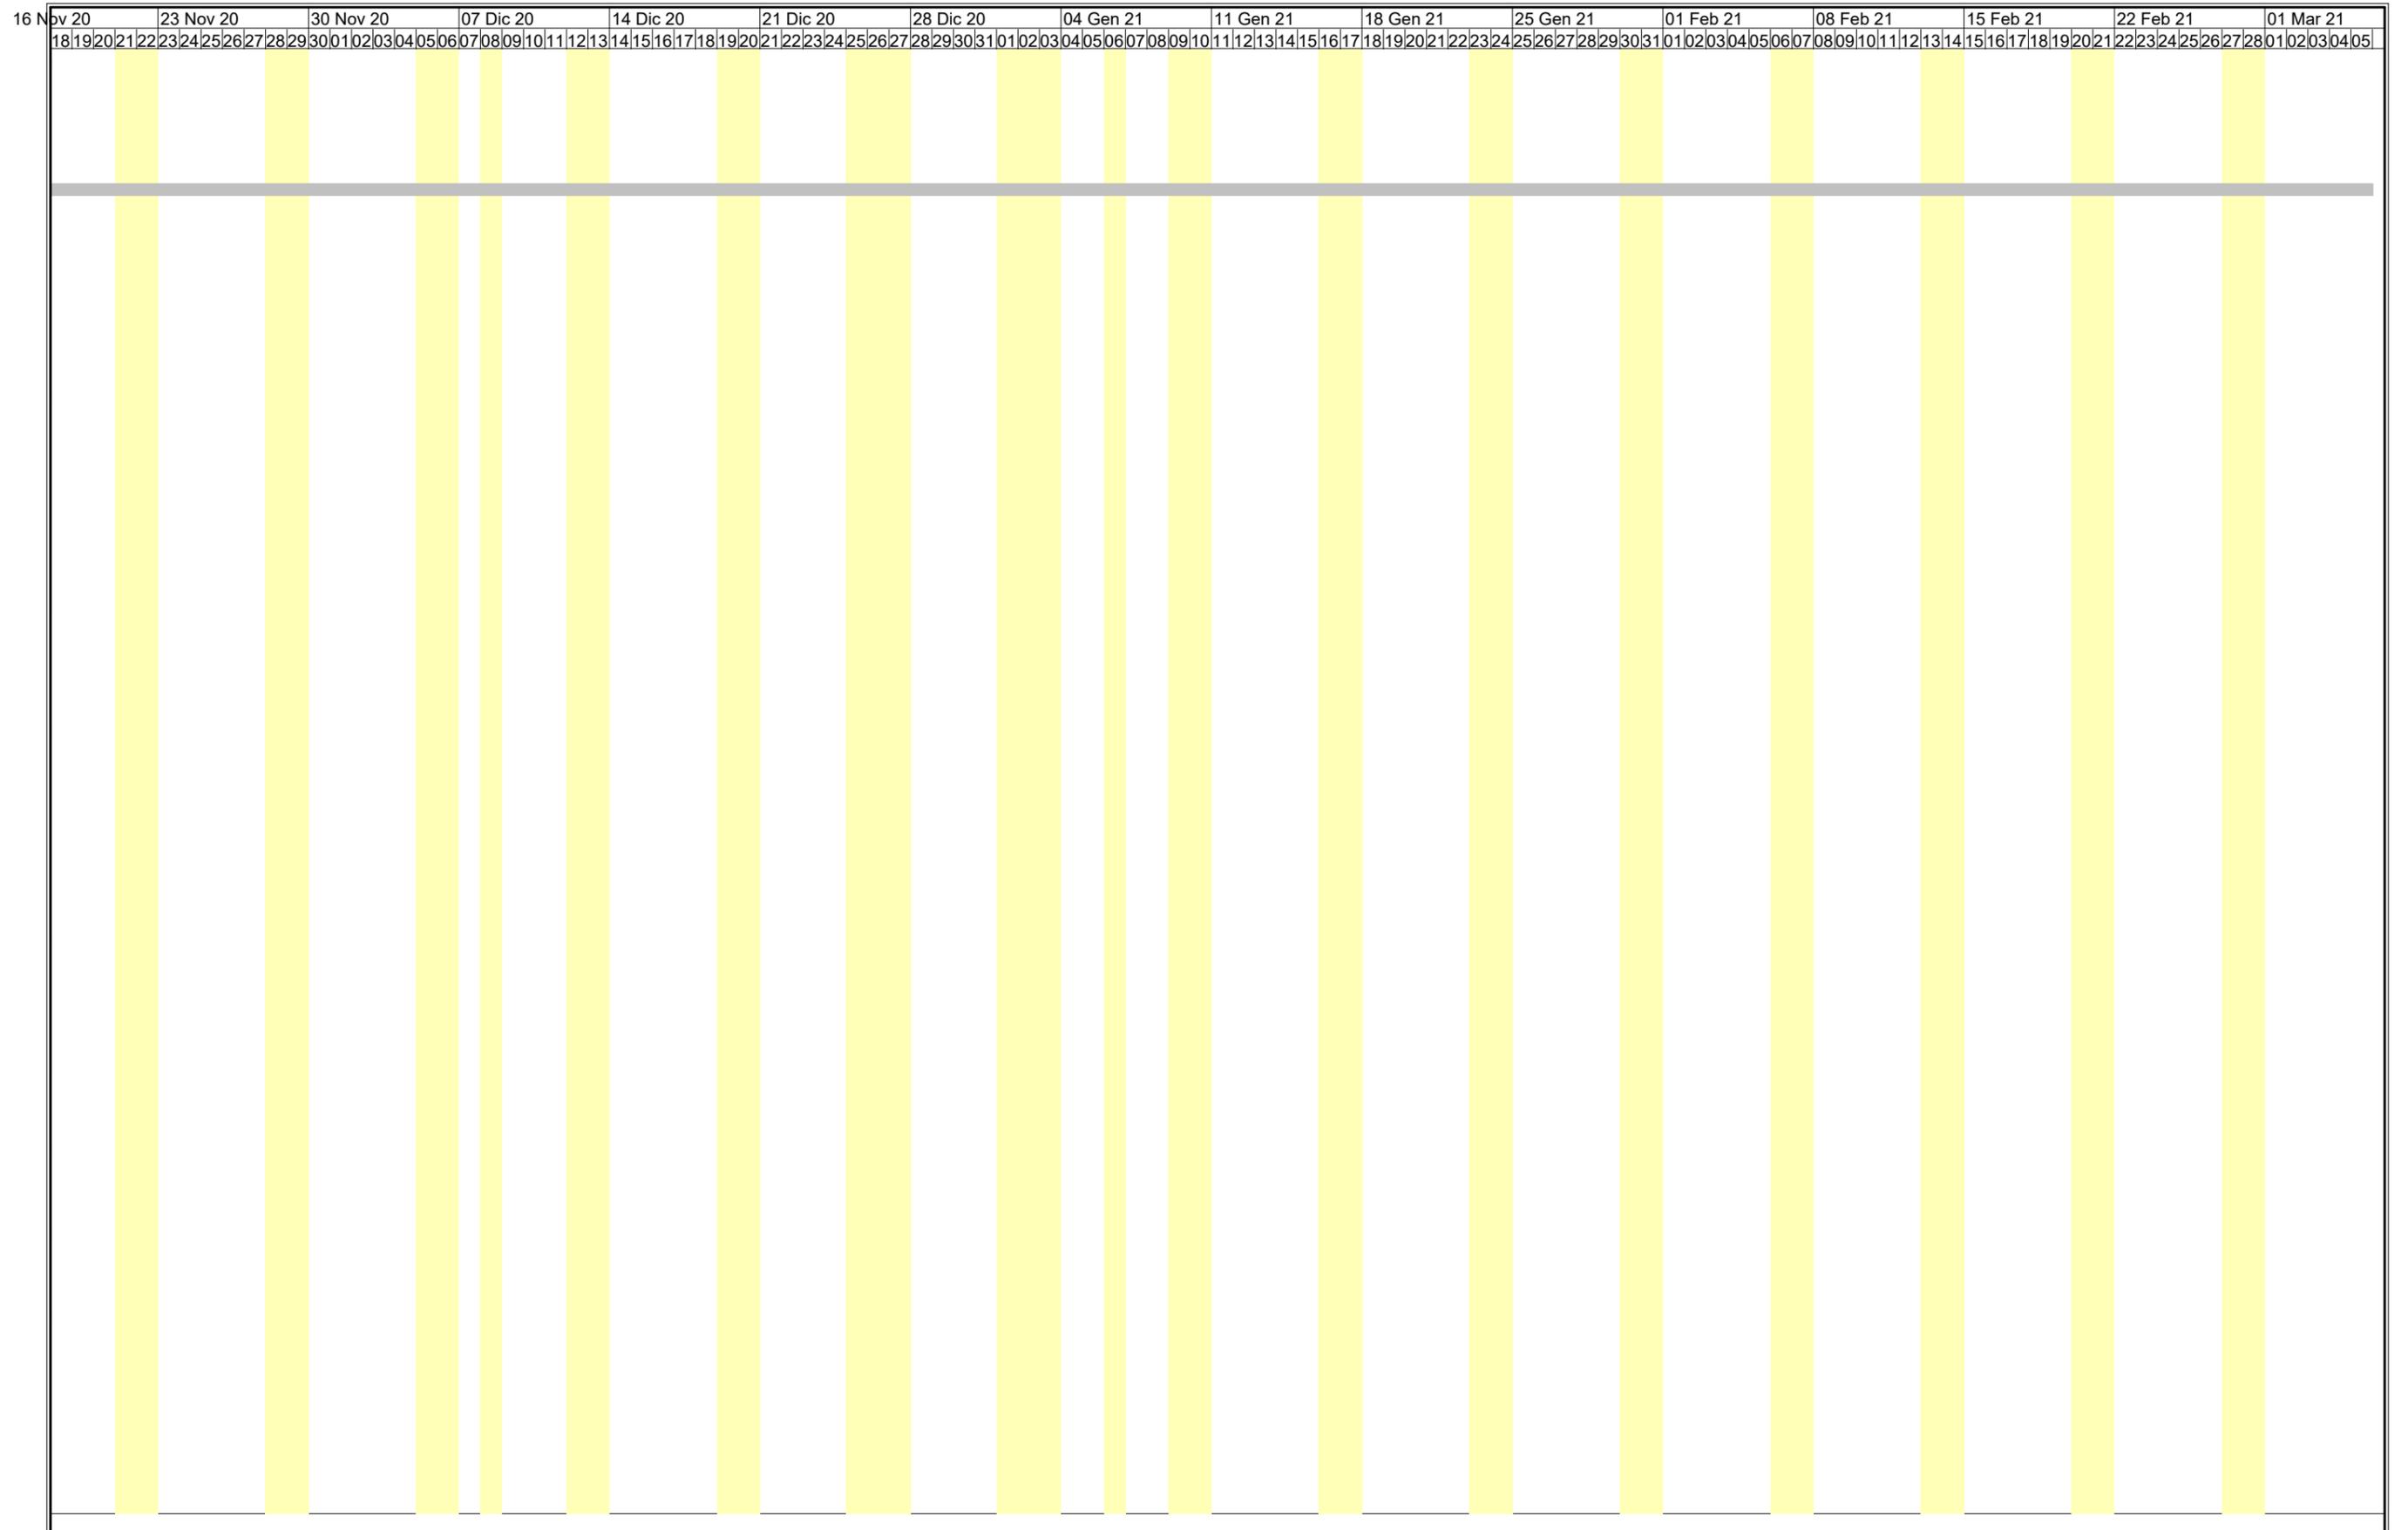


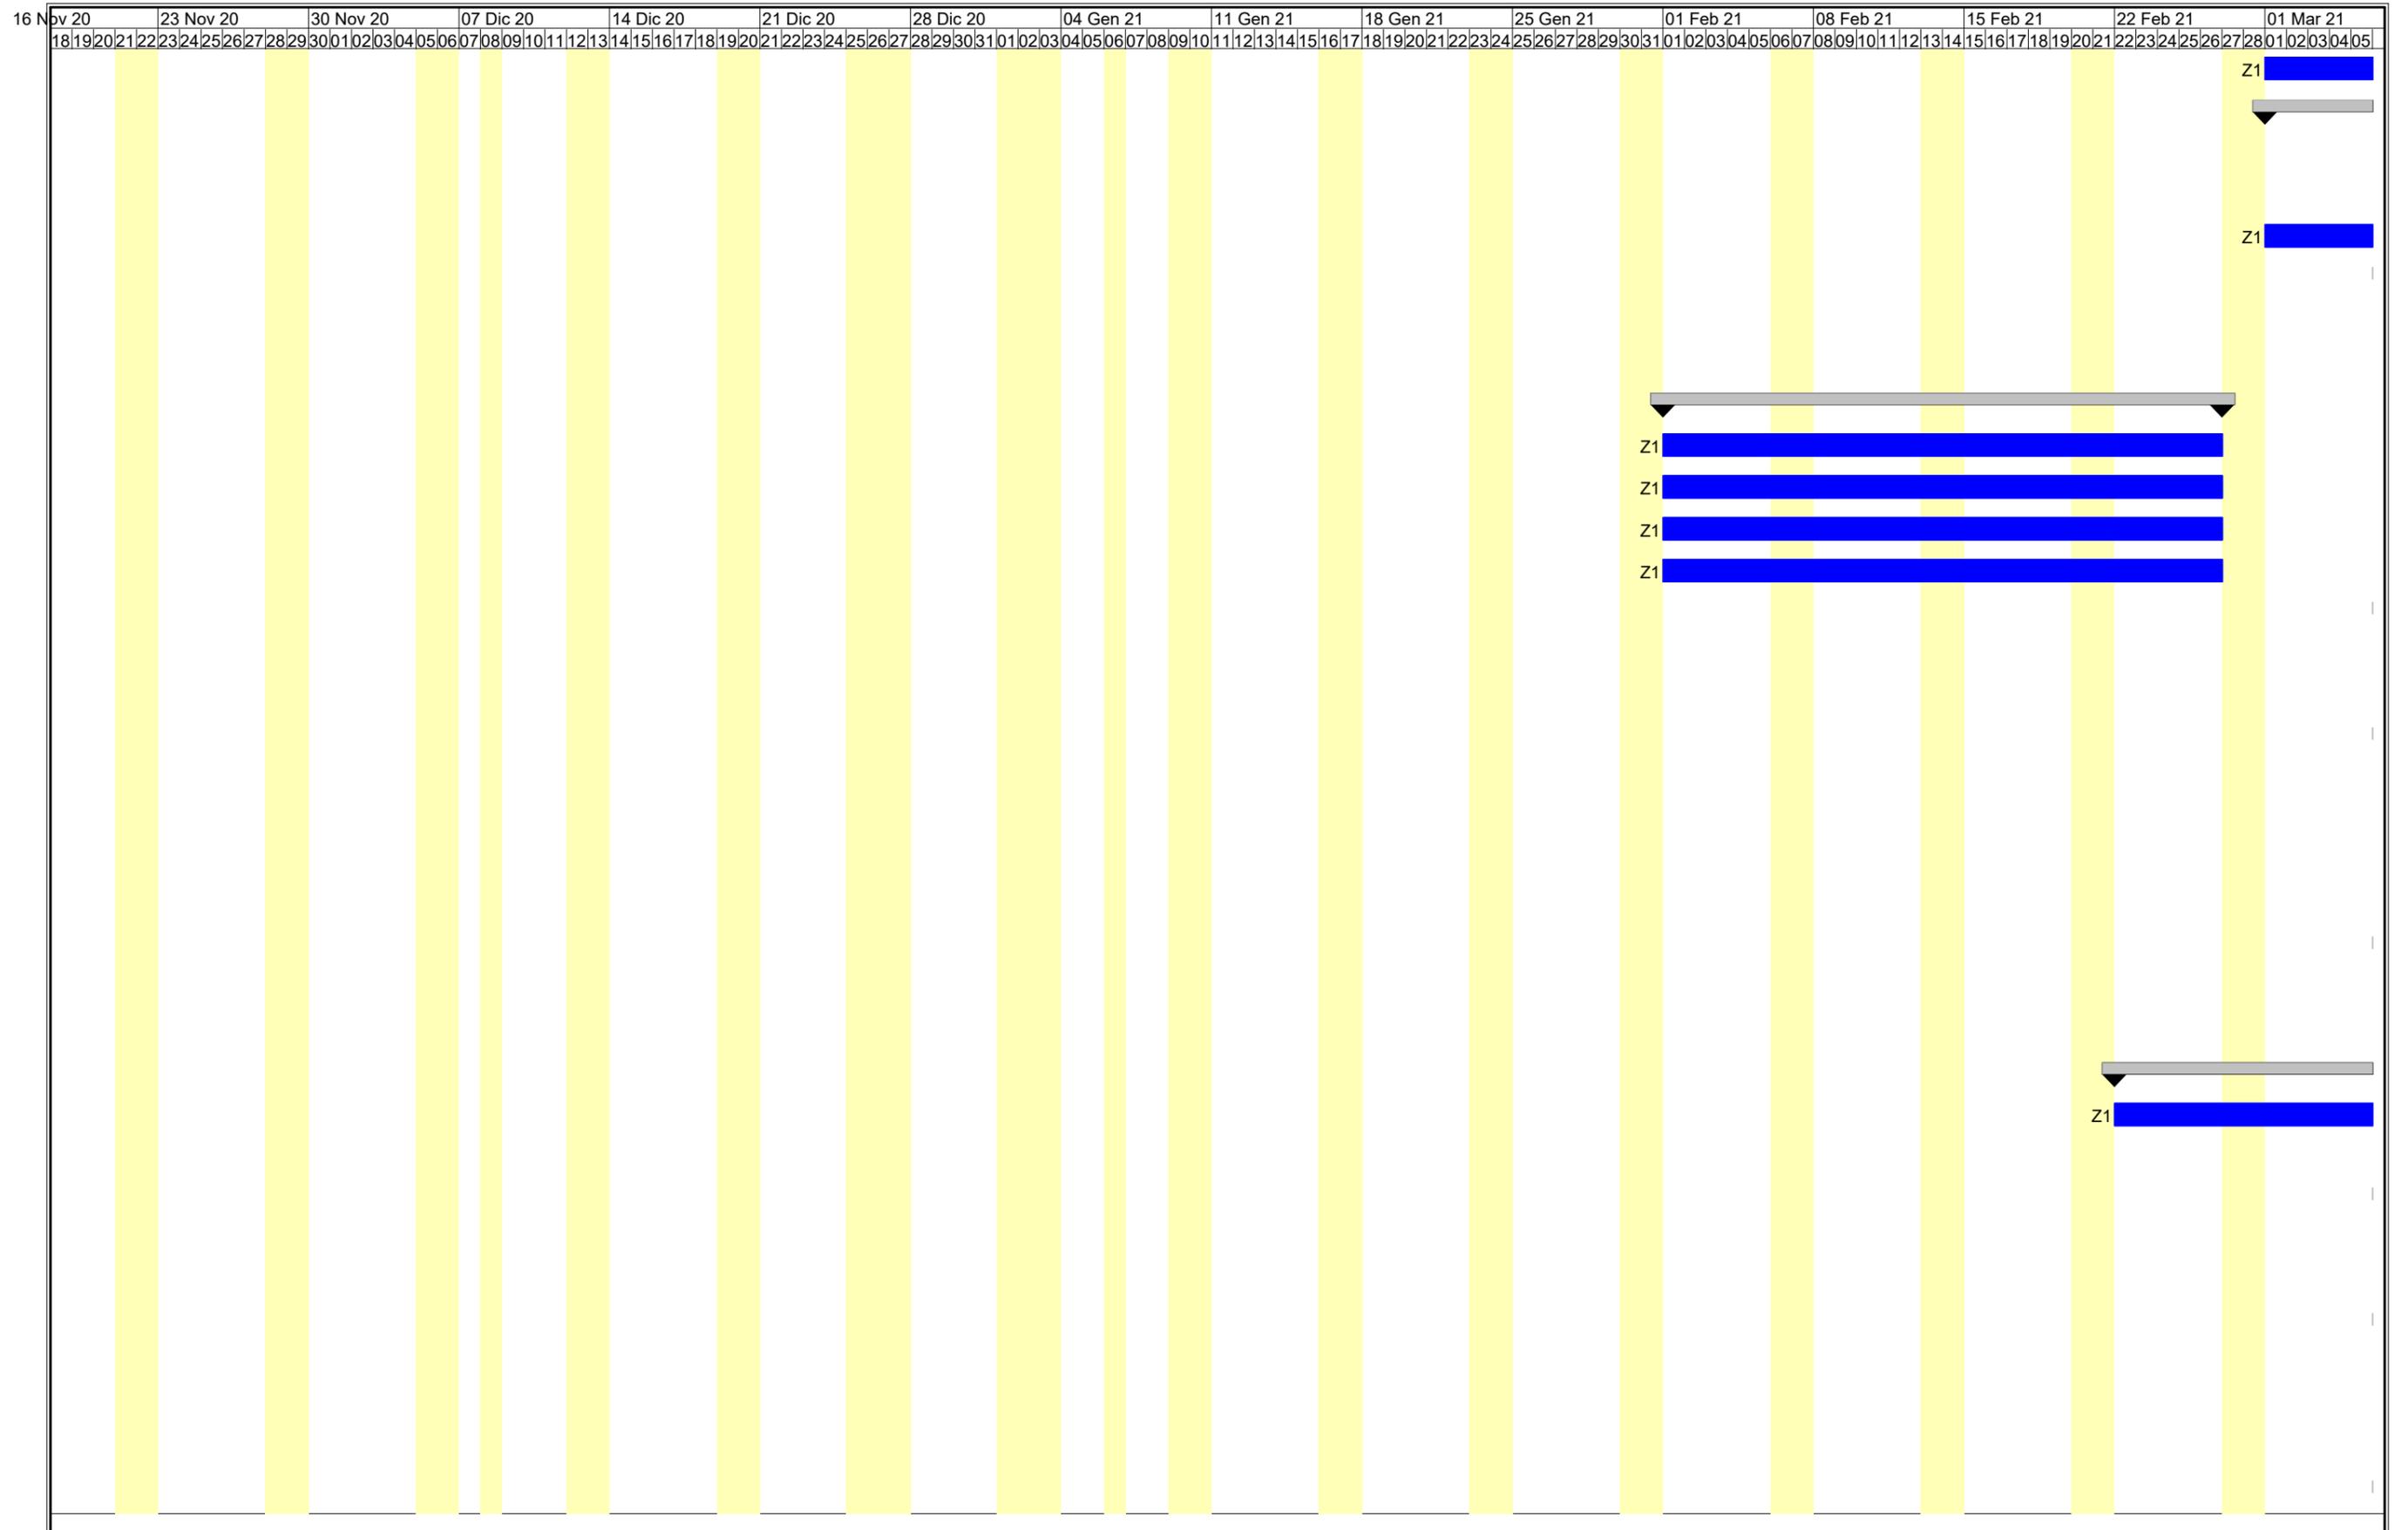


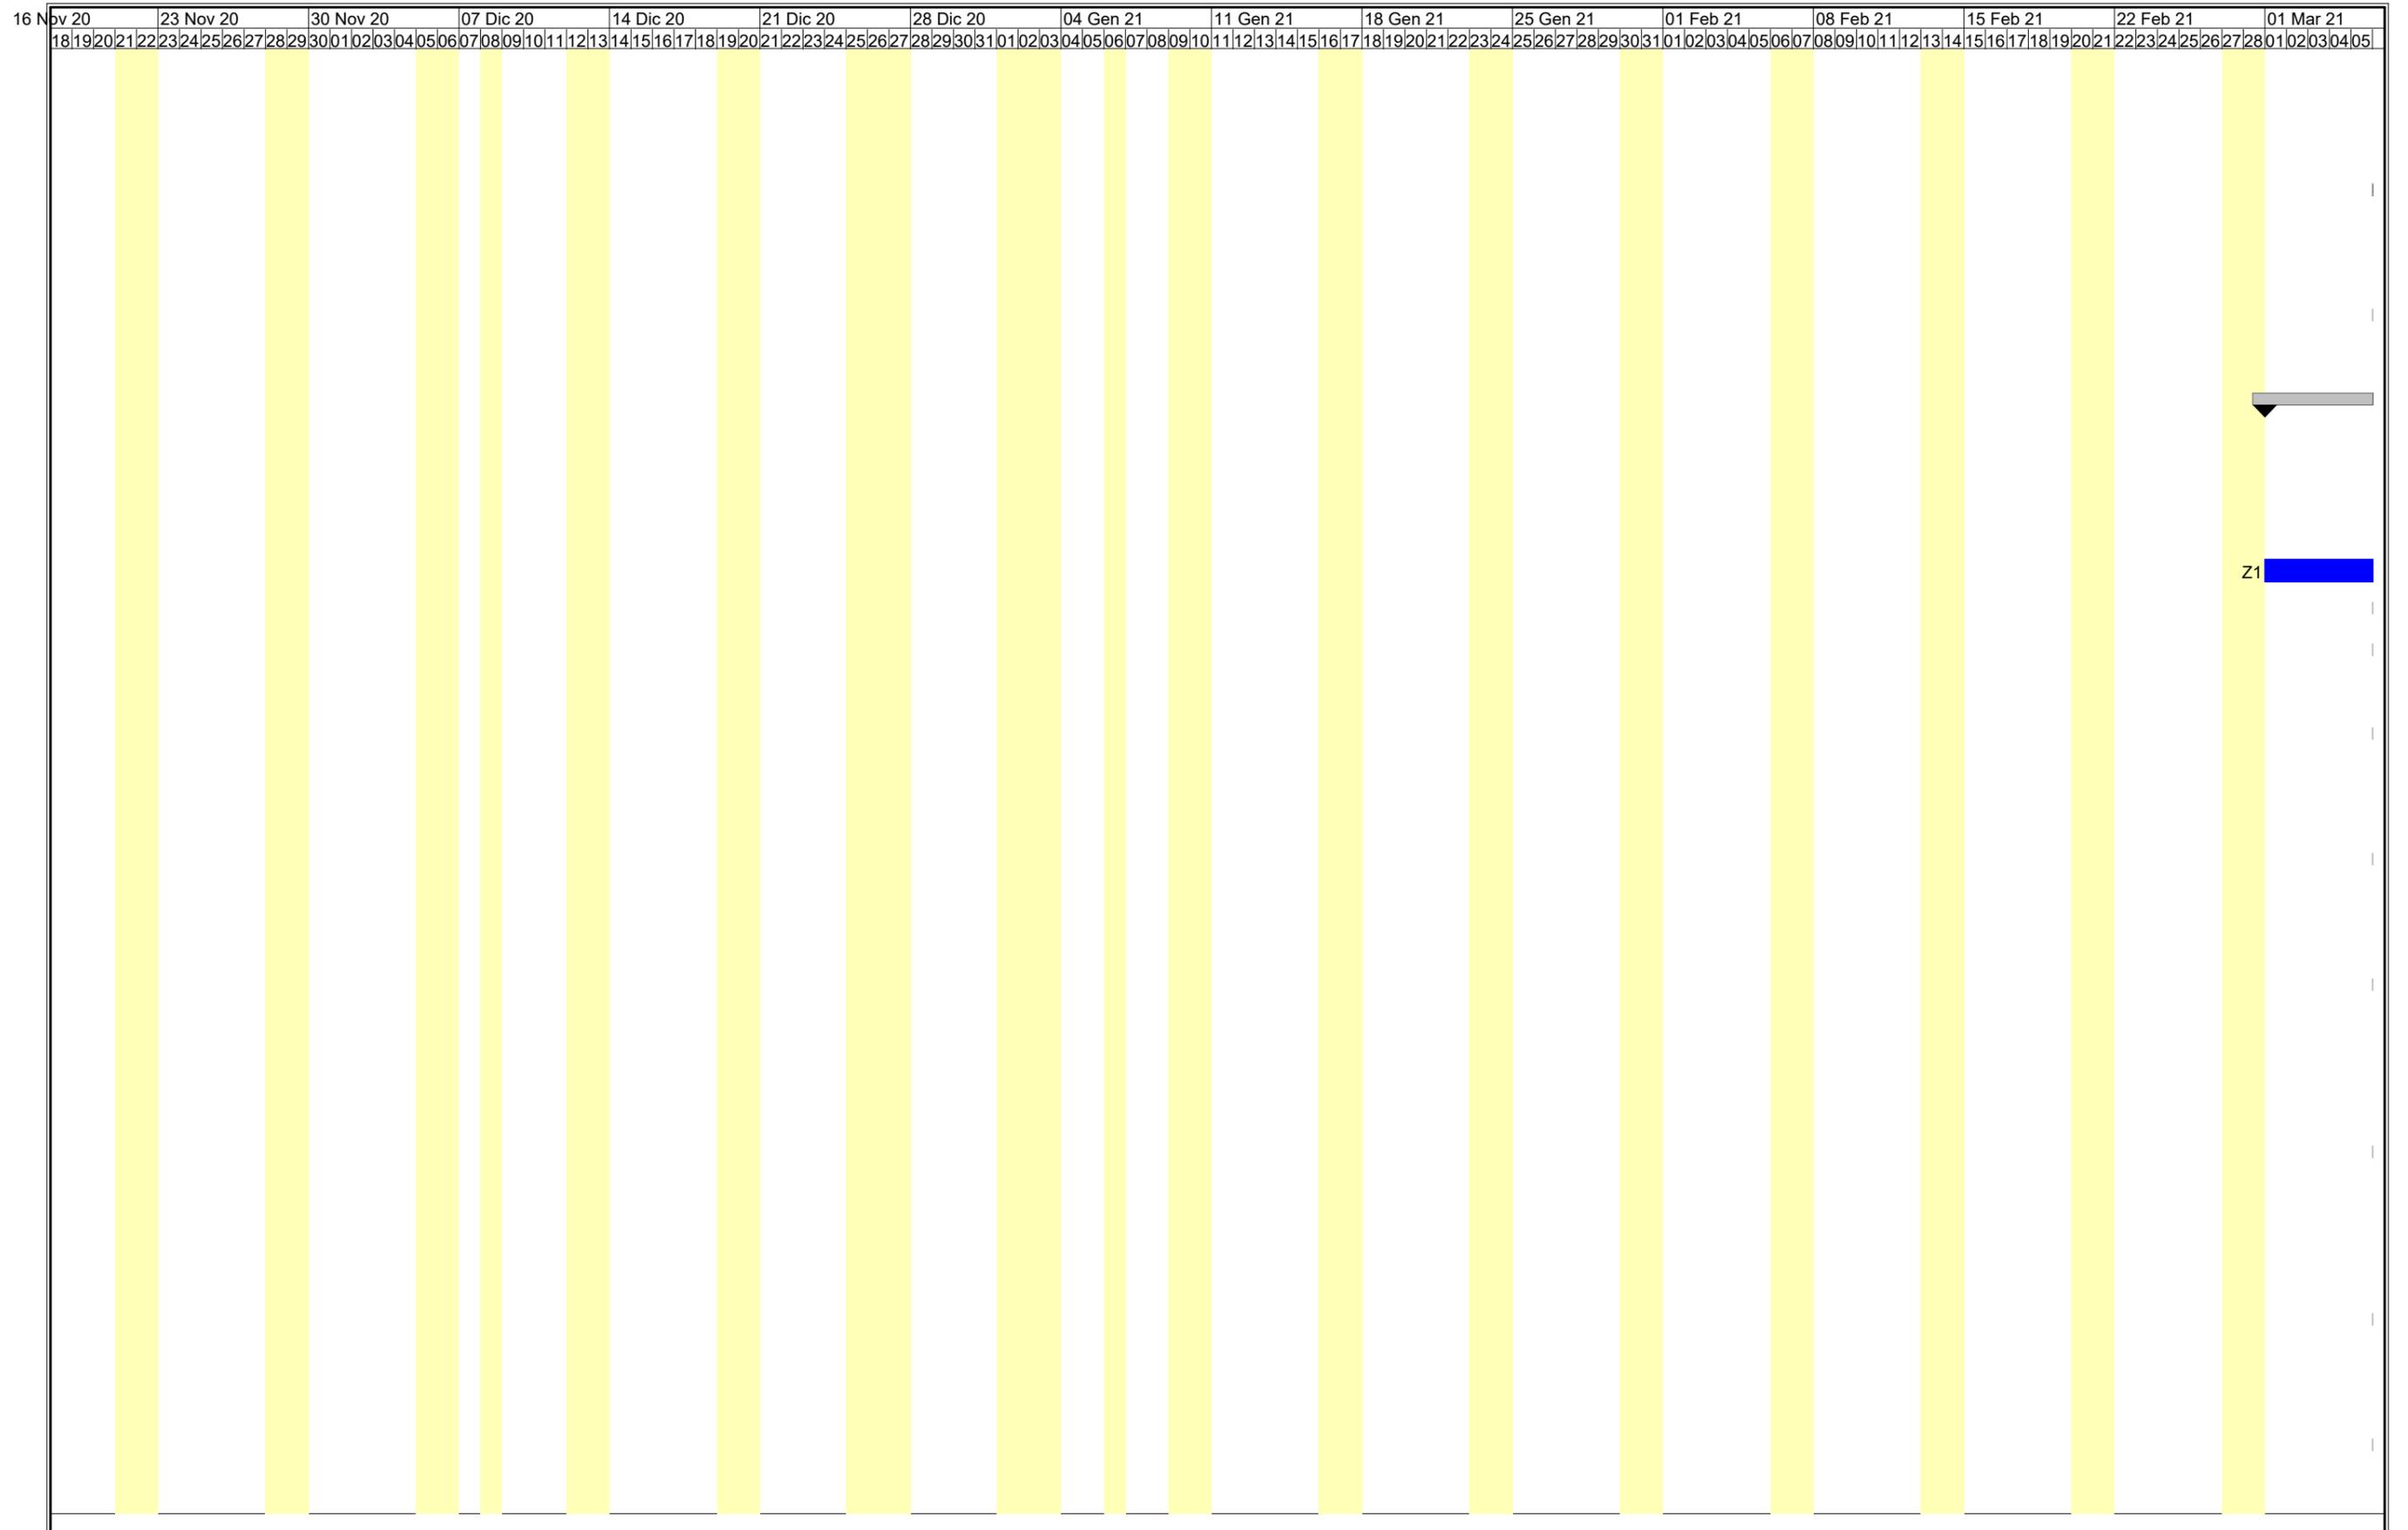

08 Mar 21				15 Mar 21				22 Mar 21				29 Mar 21				05 Apr 21				12 Apr 21				19 Apr 21				26 Apr 21				03 Mag 21				10 Mag 21				17 Mag 21				24 Mag 21				31 Mag 21				07 Giu 21				14 Giu 21				21																
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
[Yellow shaded area]																																																																												

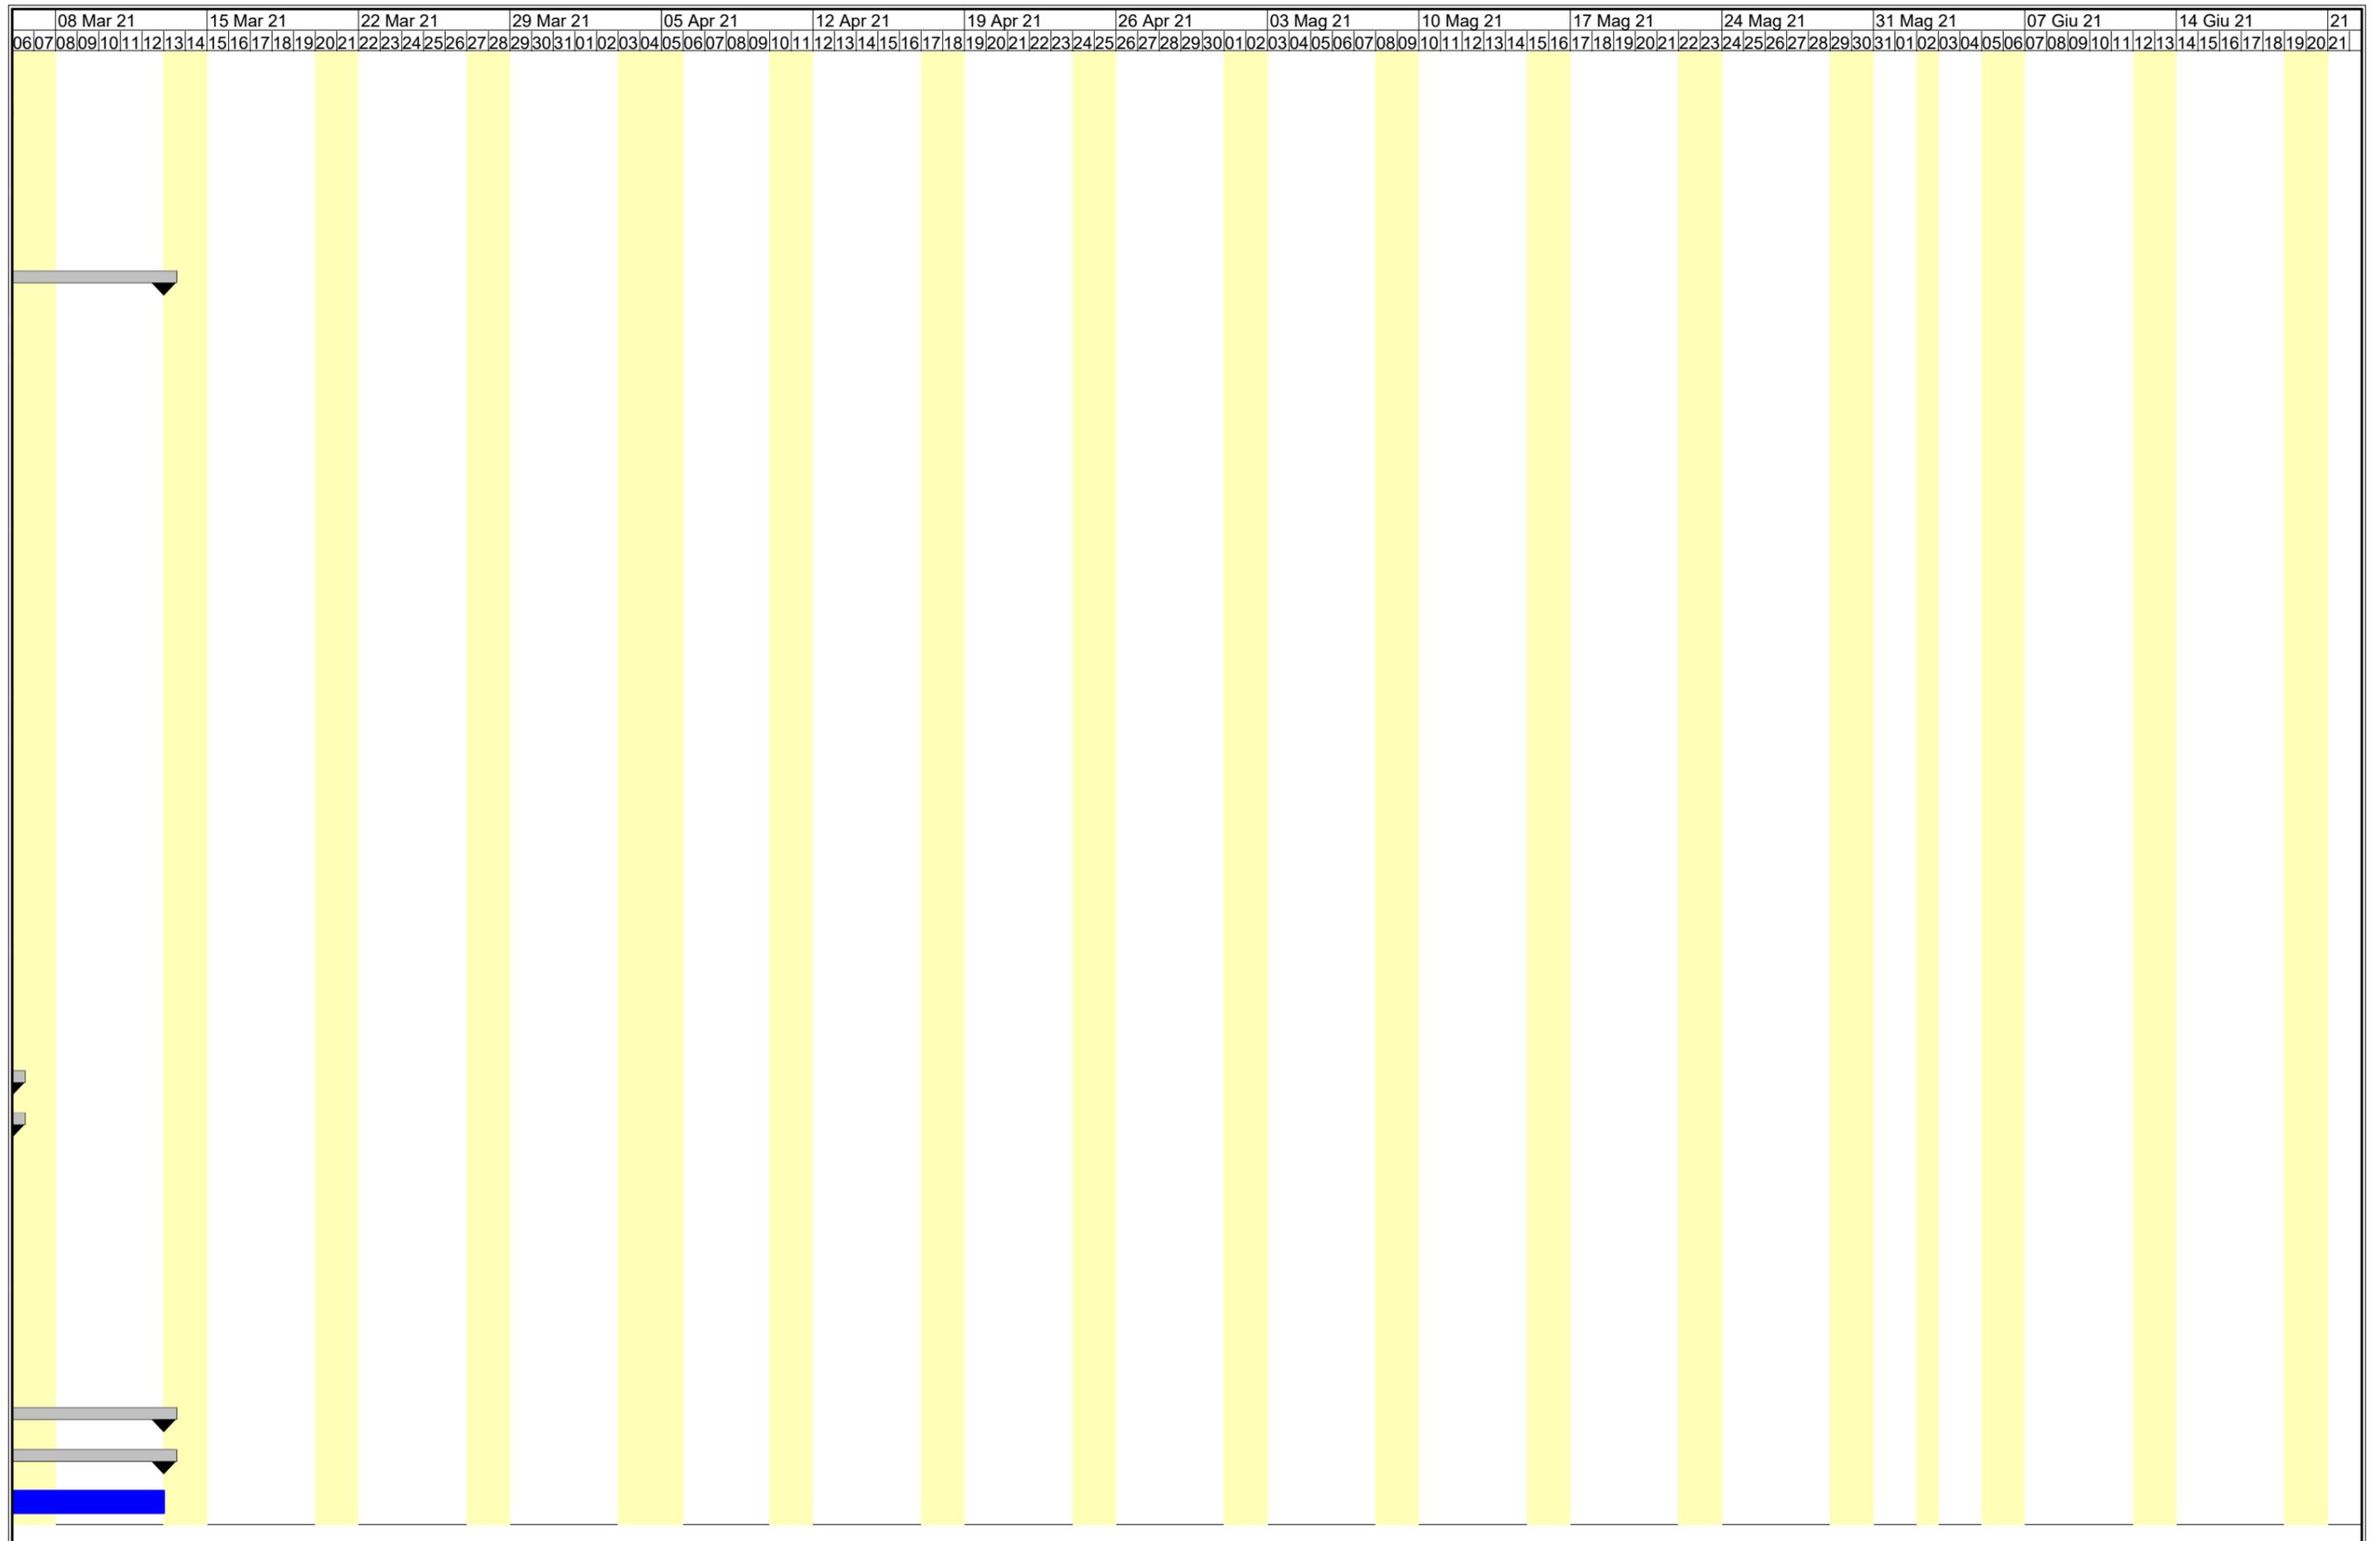


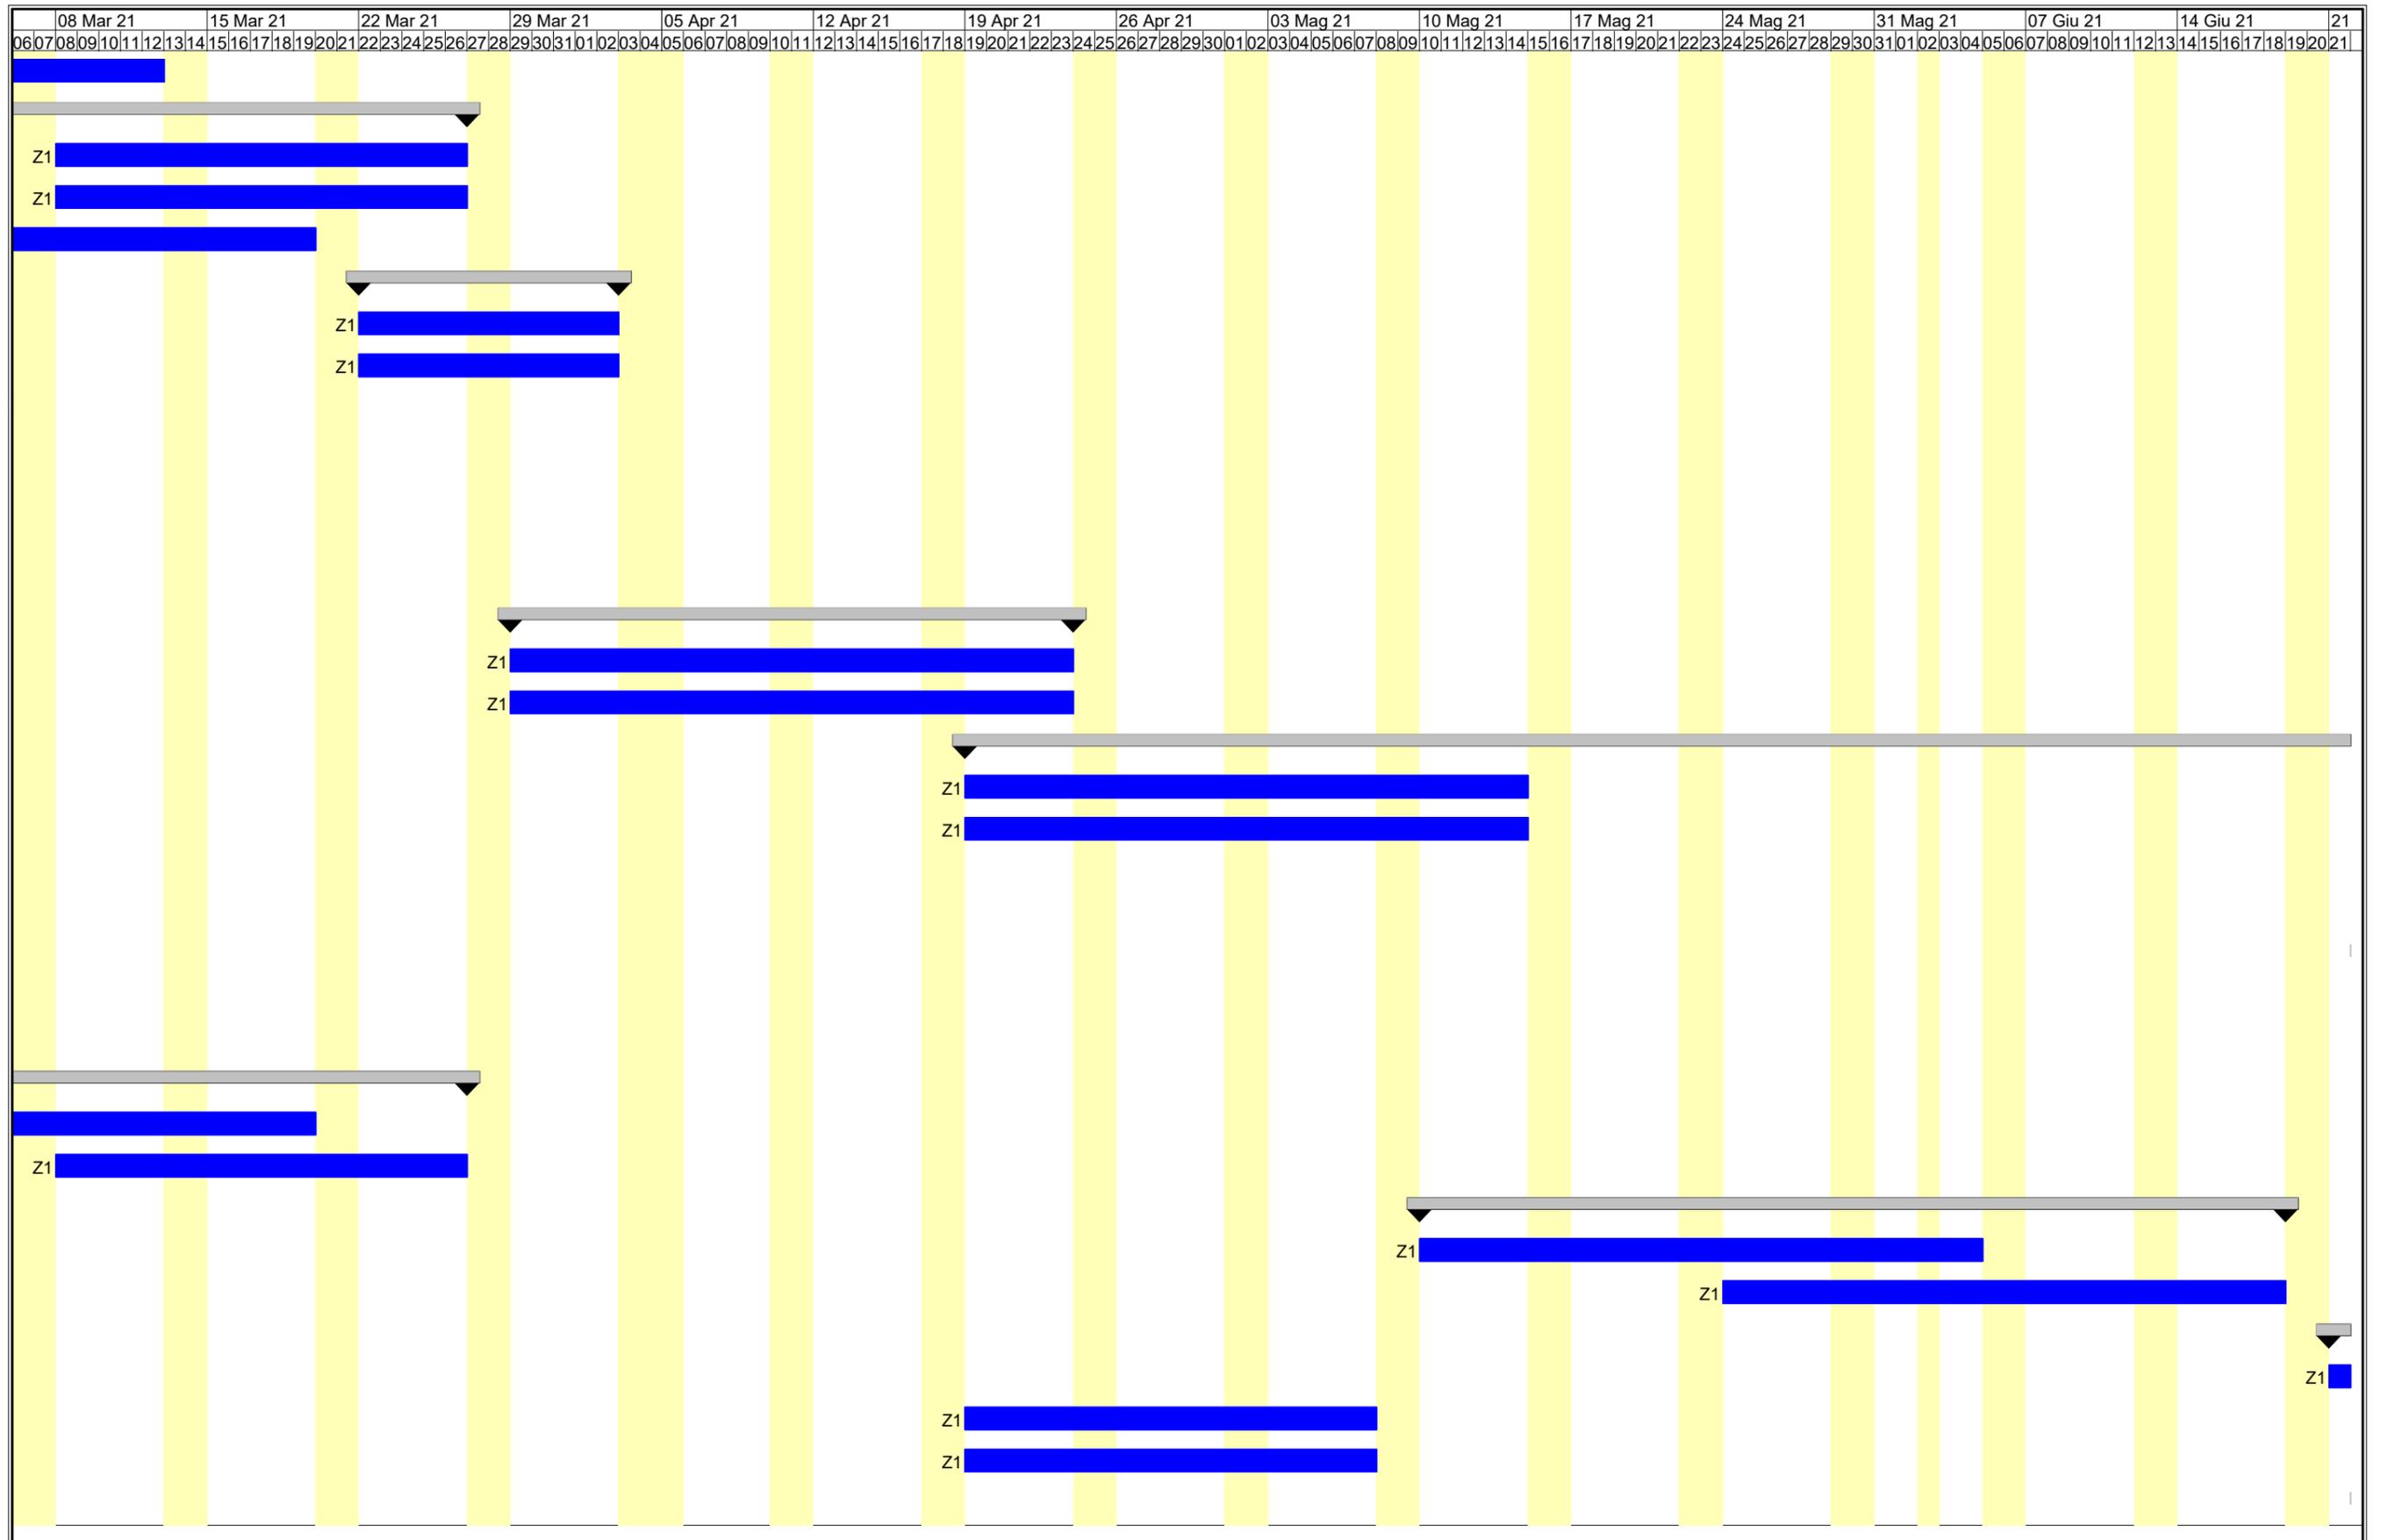


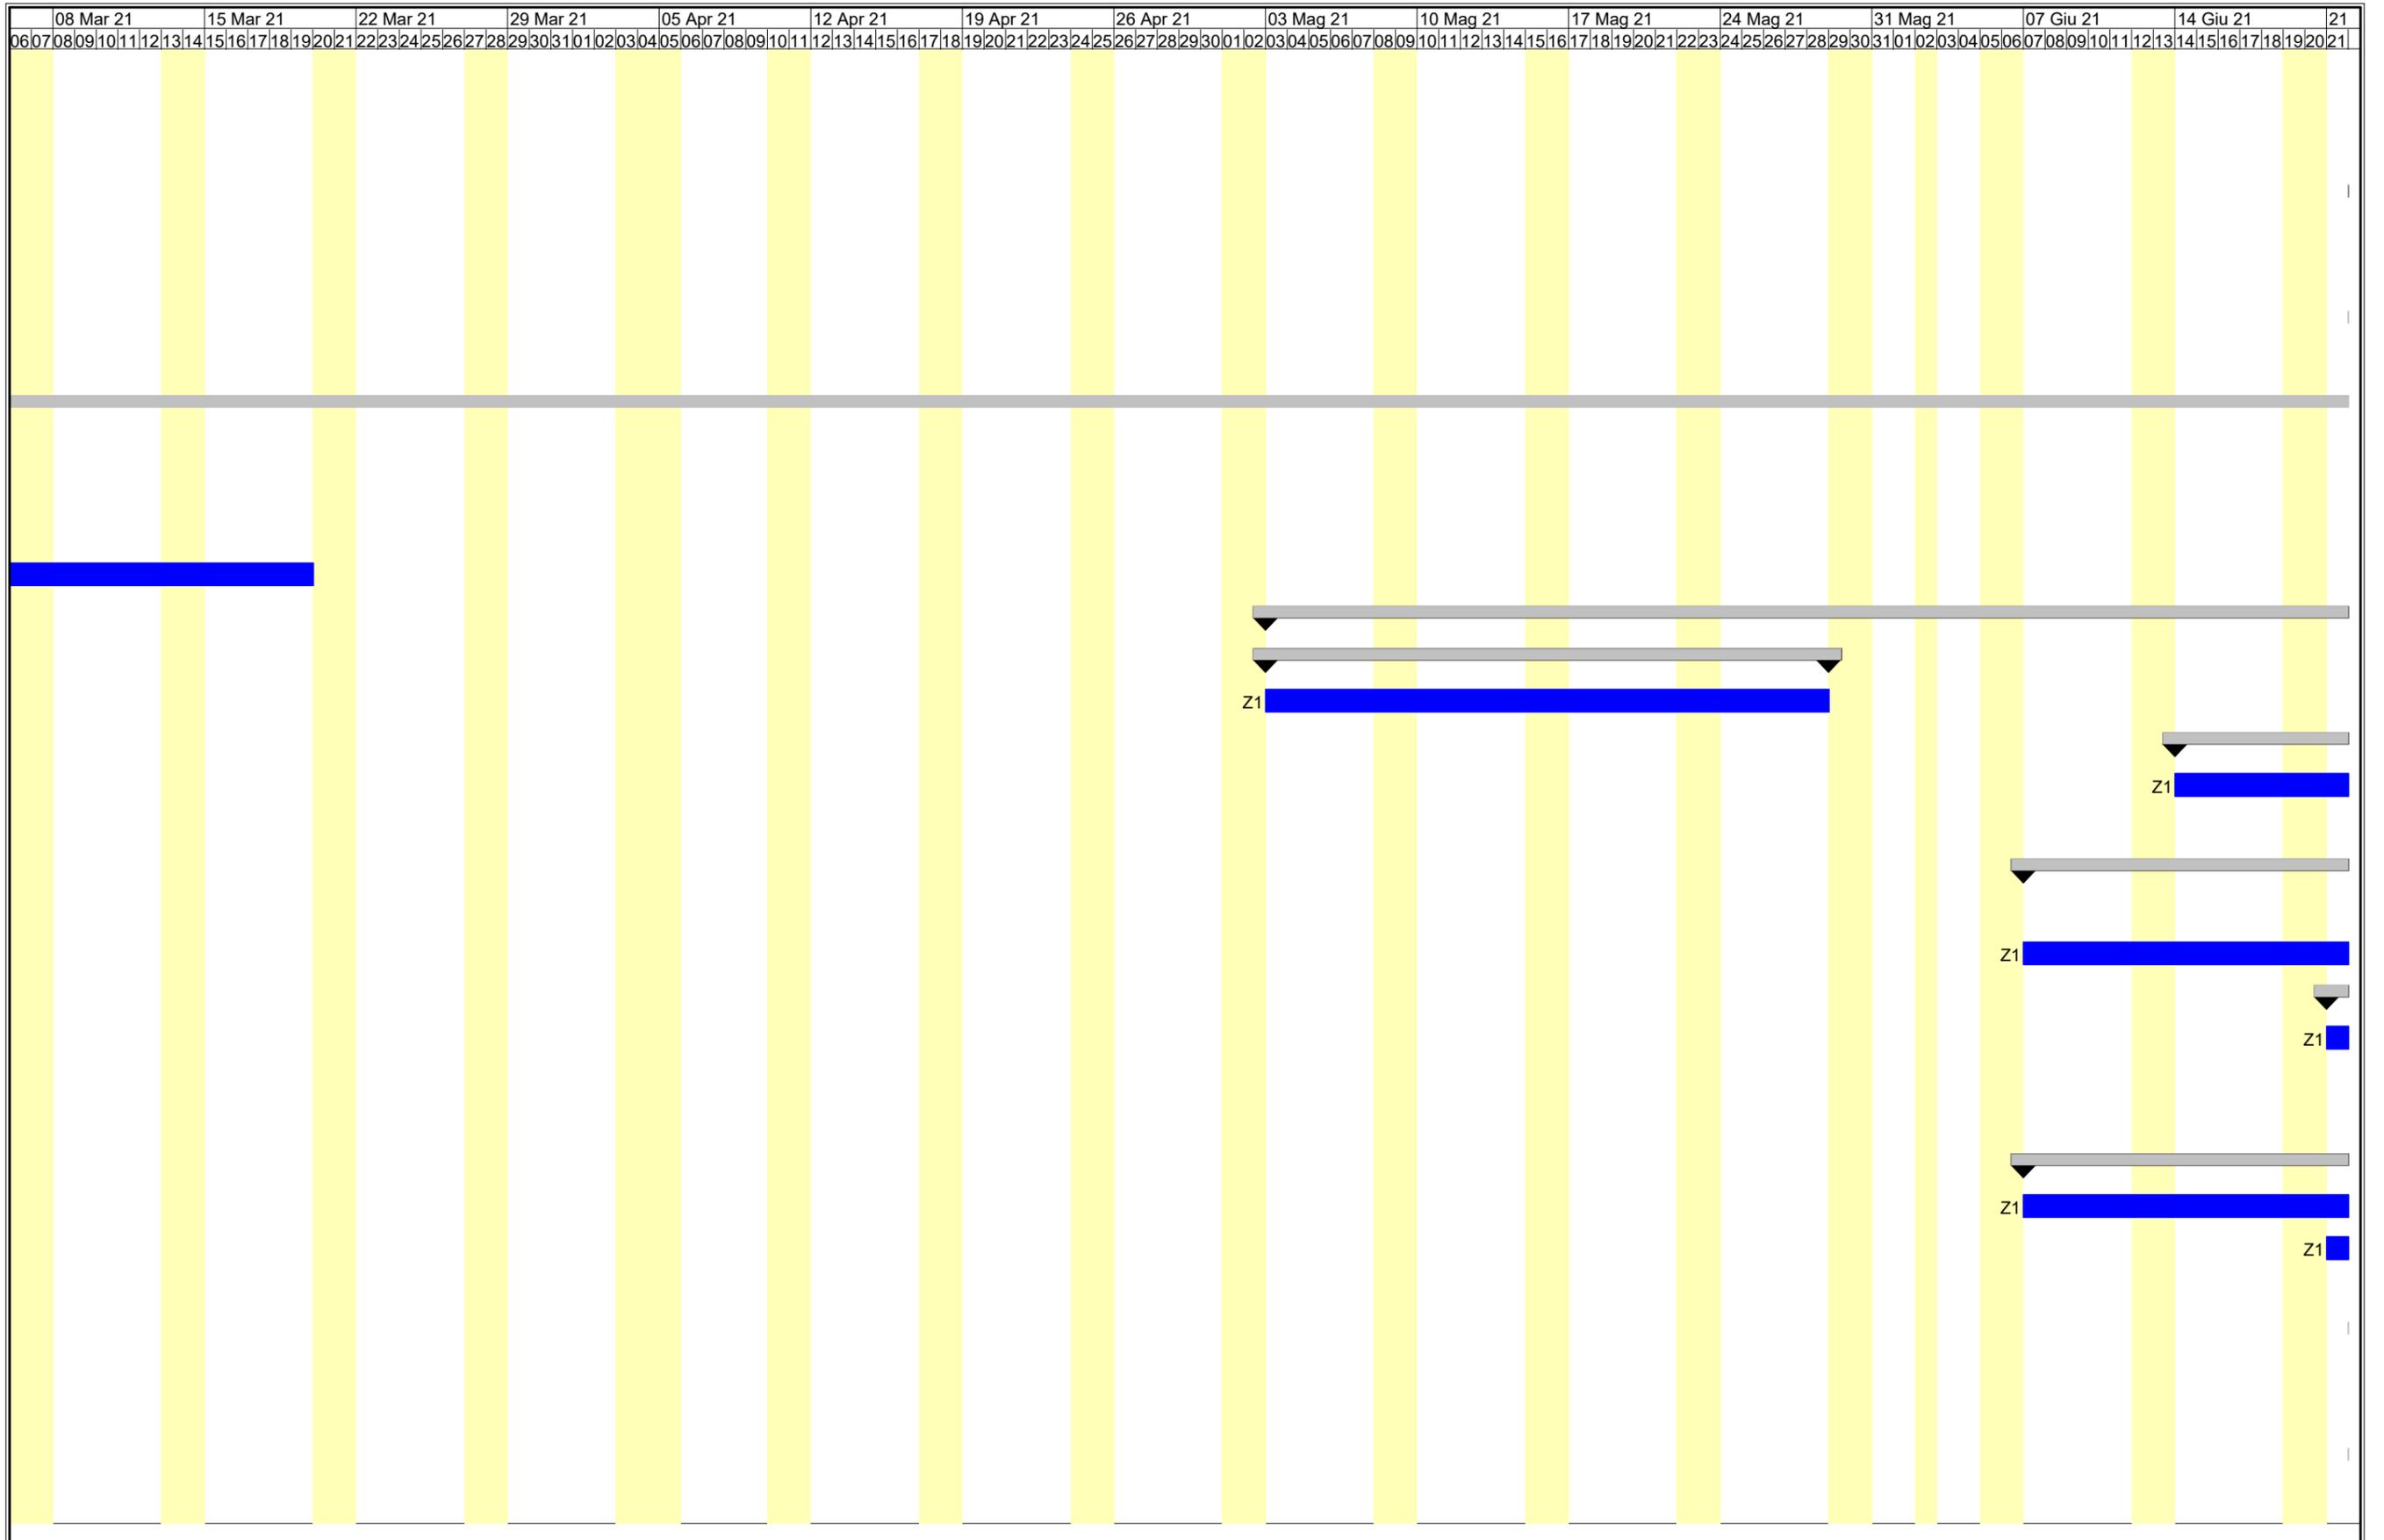

08 Mar 21			15 Mar 21			22 Mar 21			29 Mar 21			05 Apr 21			12 Apr 21			19 Apr 21			26 Apr 21			03 Mag 21			10 Mag 21			17 Mag 21			24 Mag 21			31 Mag 21			07 Giu 21			14 Giu 21			21																																
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
[Empty cells with yellow background shading]																																																																													



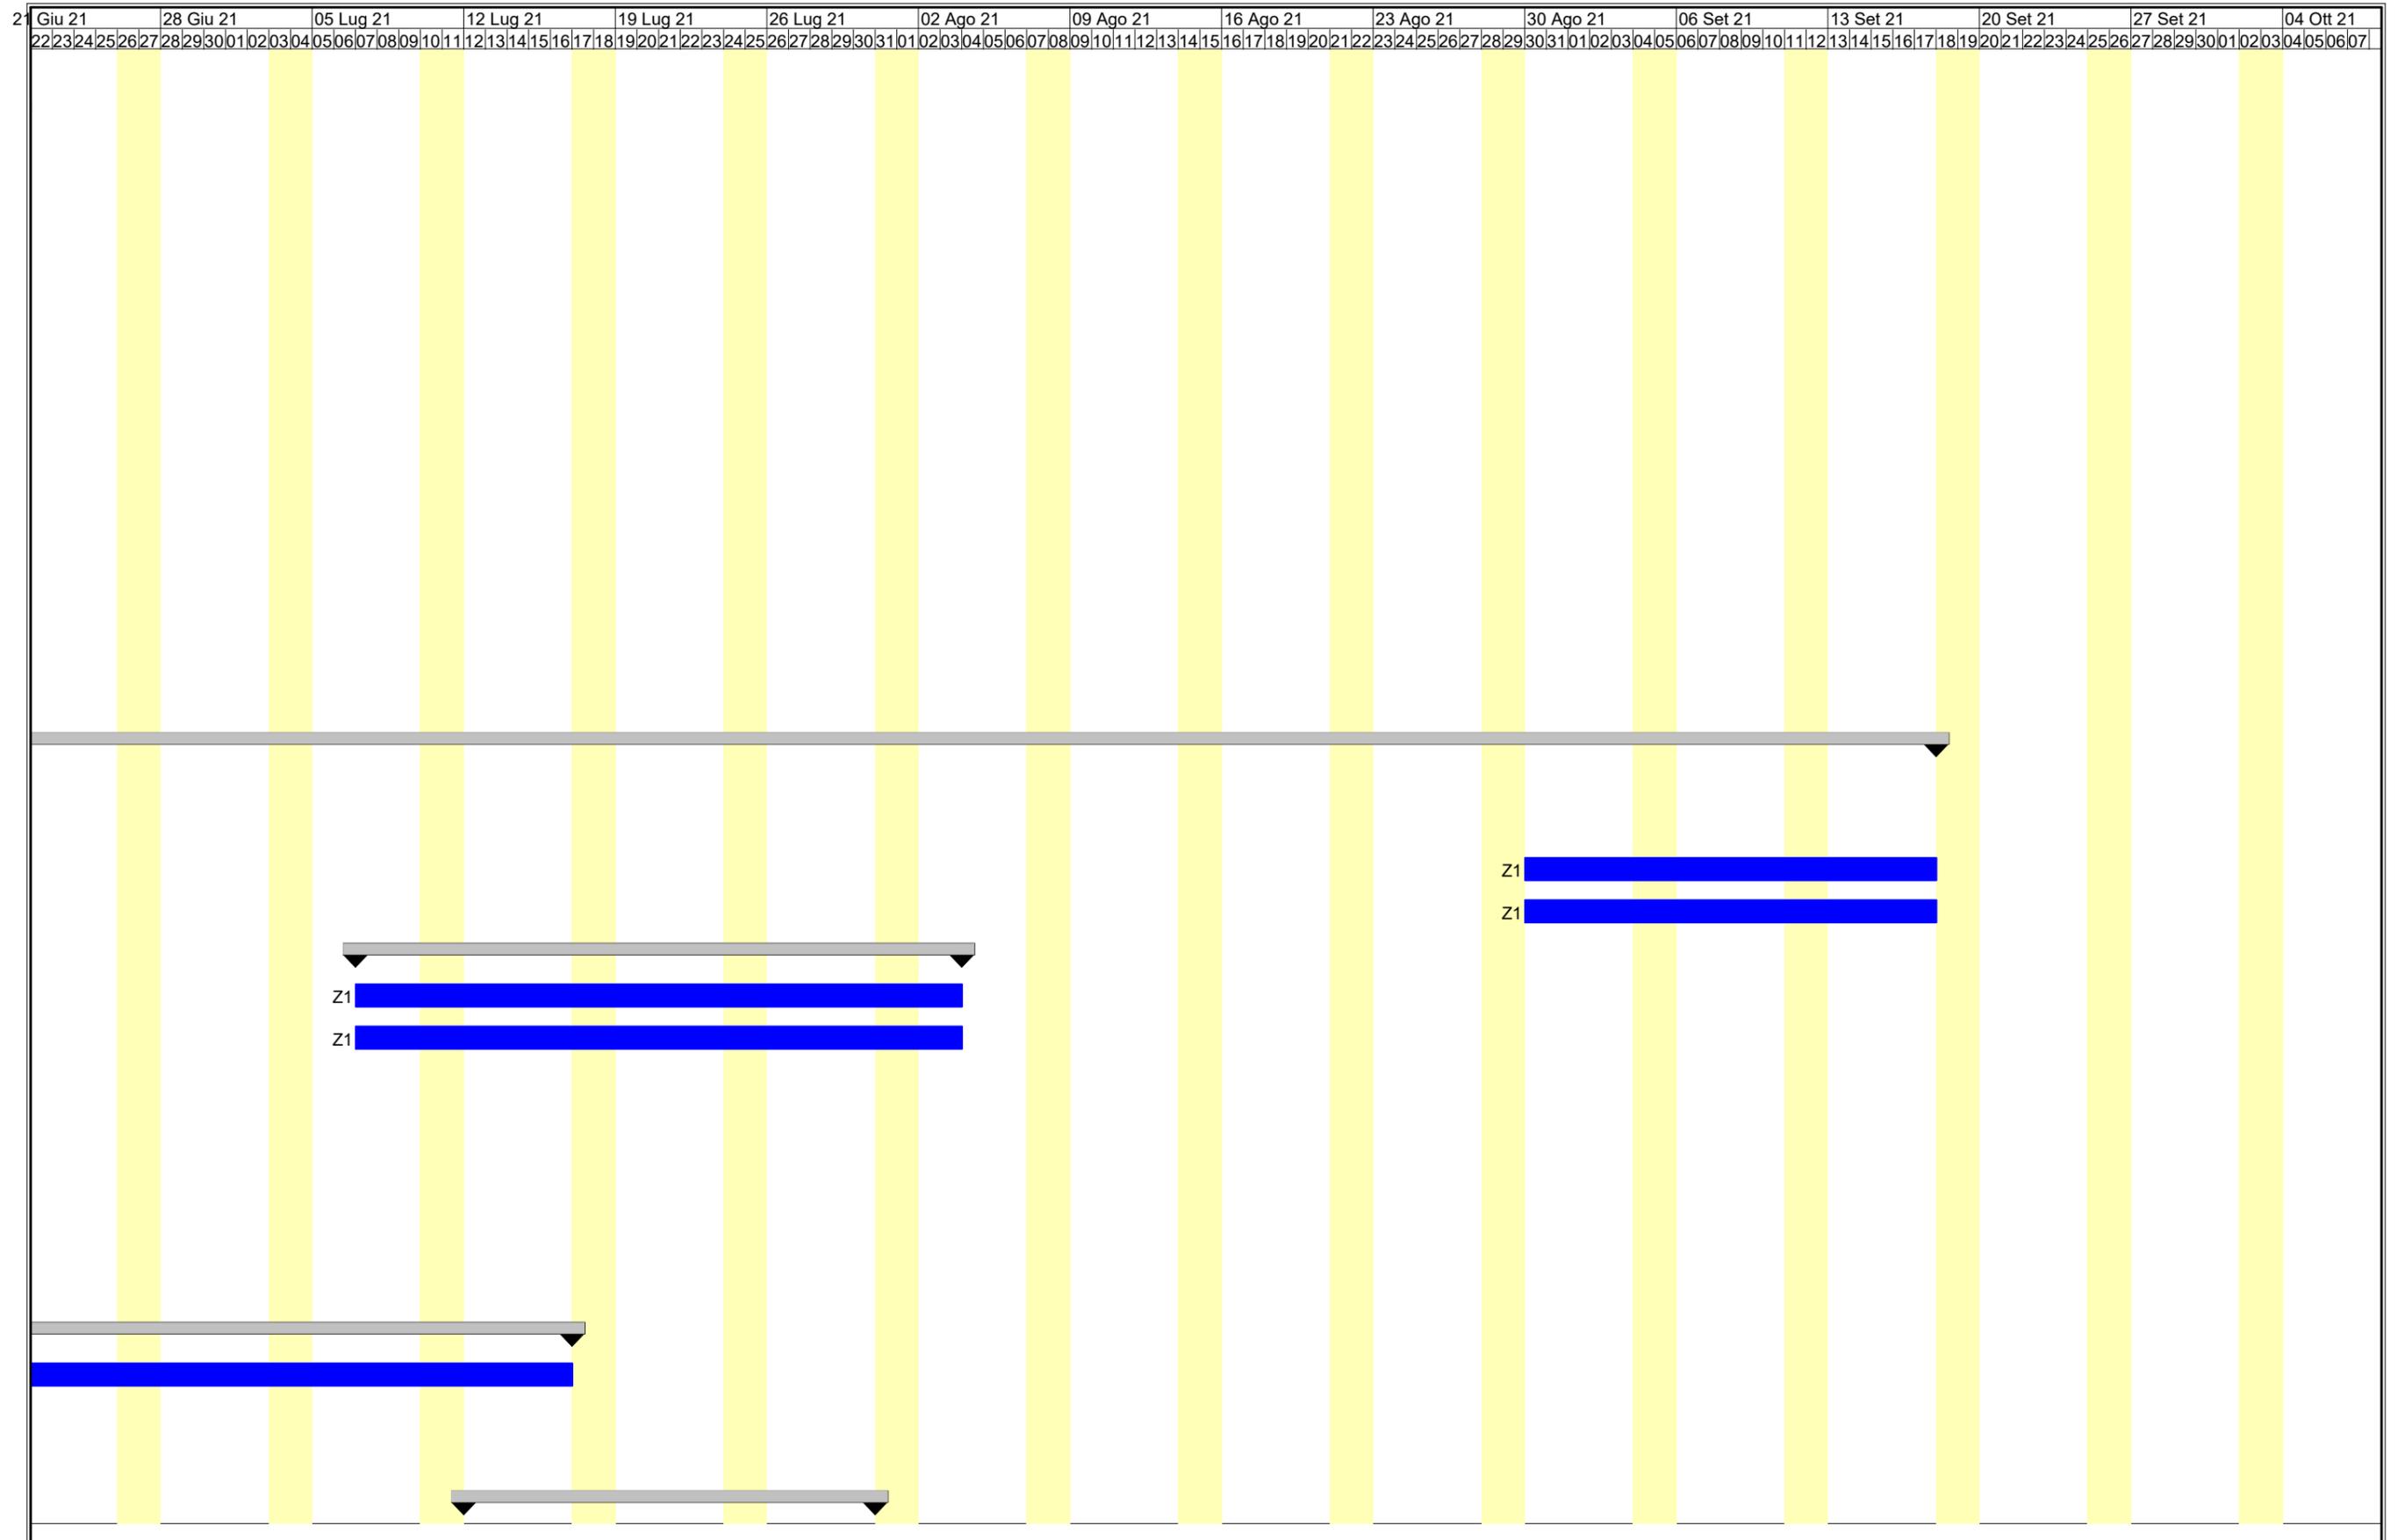


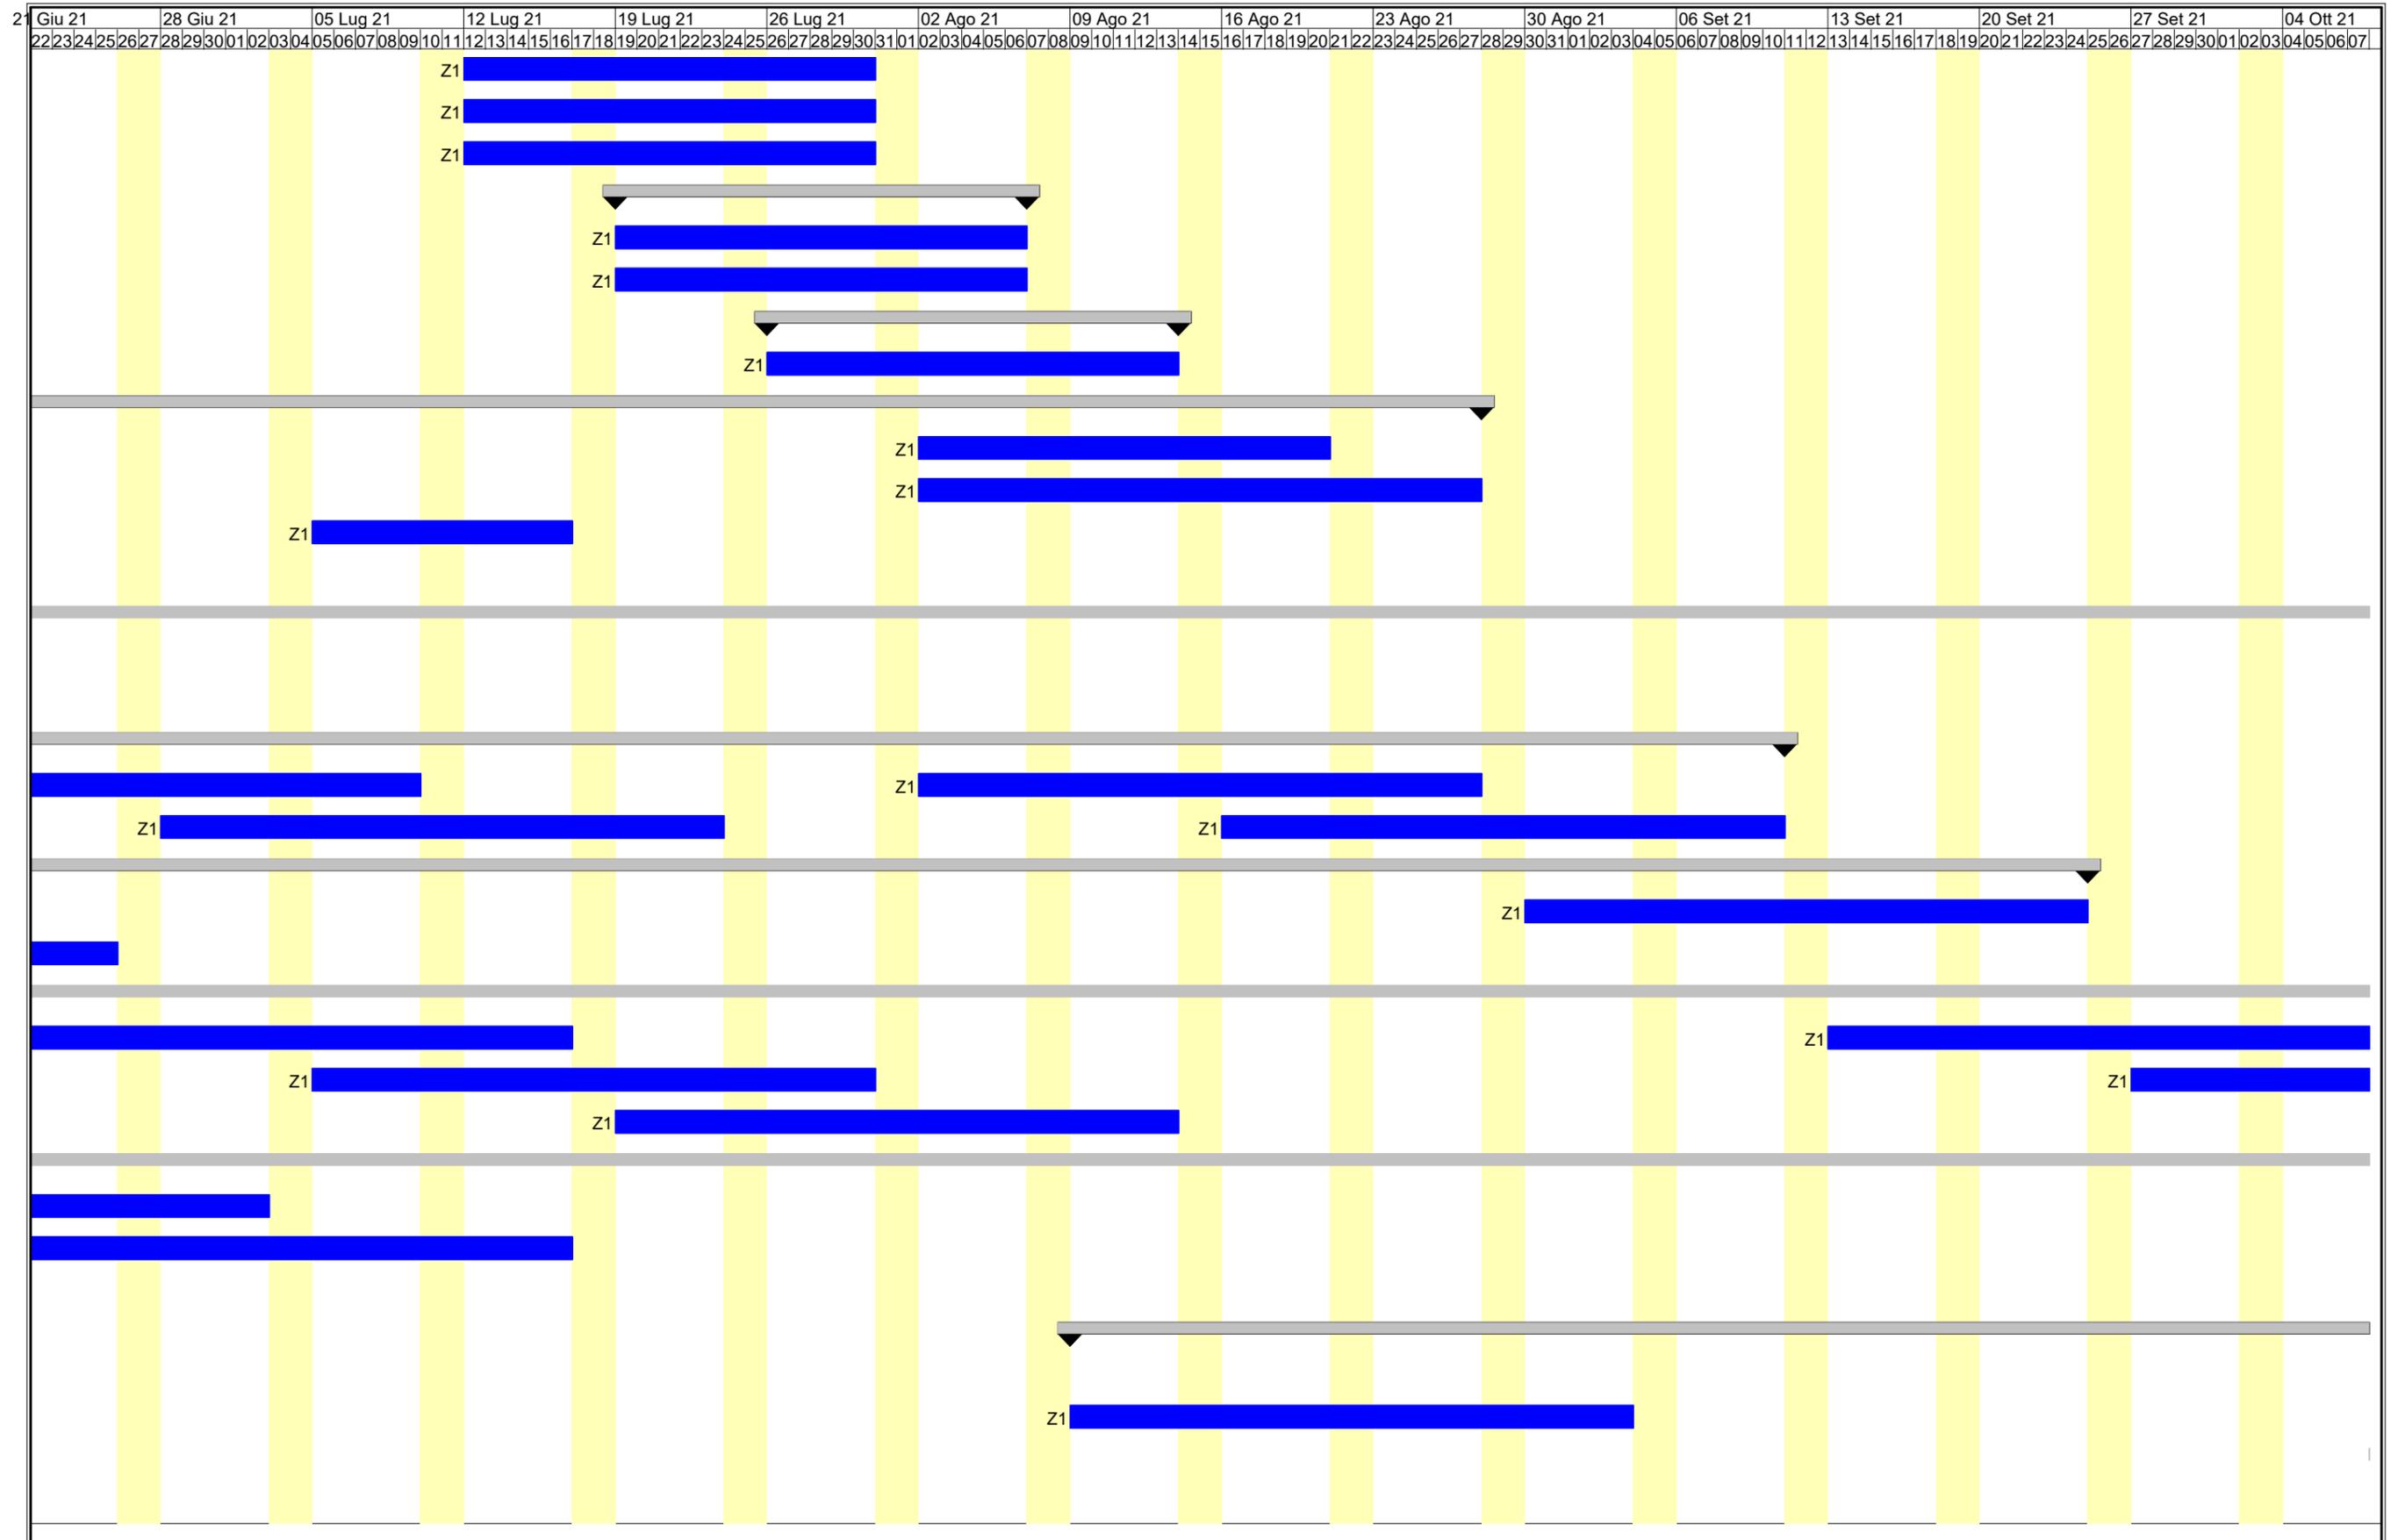

11 Ott 21			18 Ott 21			25 Ott 21			01 Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21			13 Dic 21			20 Dic 21			27 Dic 21			03 Gen 22			10 Gen 22			17 Gen 22					
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
[Empty cells with yellow background shading]																																															

11 Ott 21			18 Ott 21			25 Ott 21			01 Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21			13 Dic 21			20 Dic 21			27 Dic 21			03 Gen 22			10 Gen 22			17 Gen 22					
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

11 Ott 21			18 Ott 21			25 Ott 21			01 Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21			13 Dic 21			20 Dic 21			27 Dic 21			03 Gen 22			10 Gen 22			17 Gen 22					
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

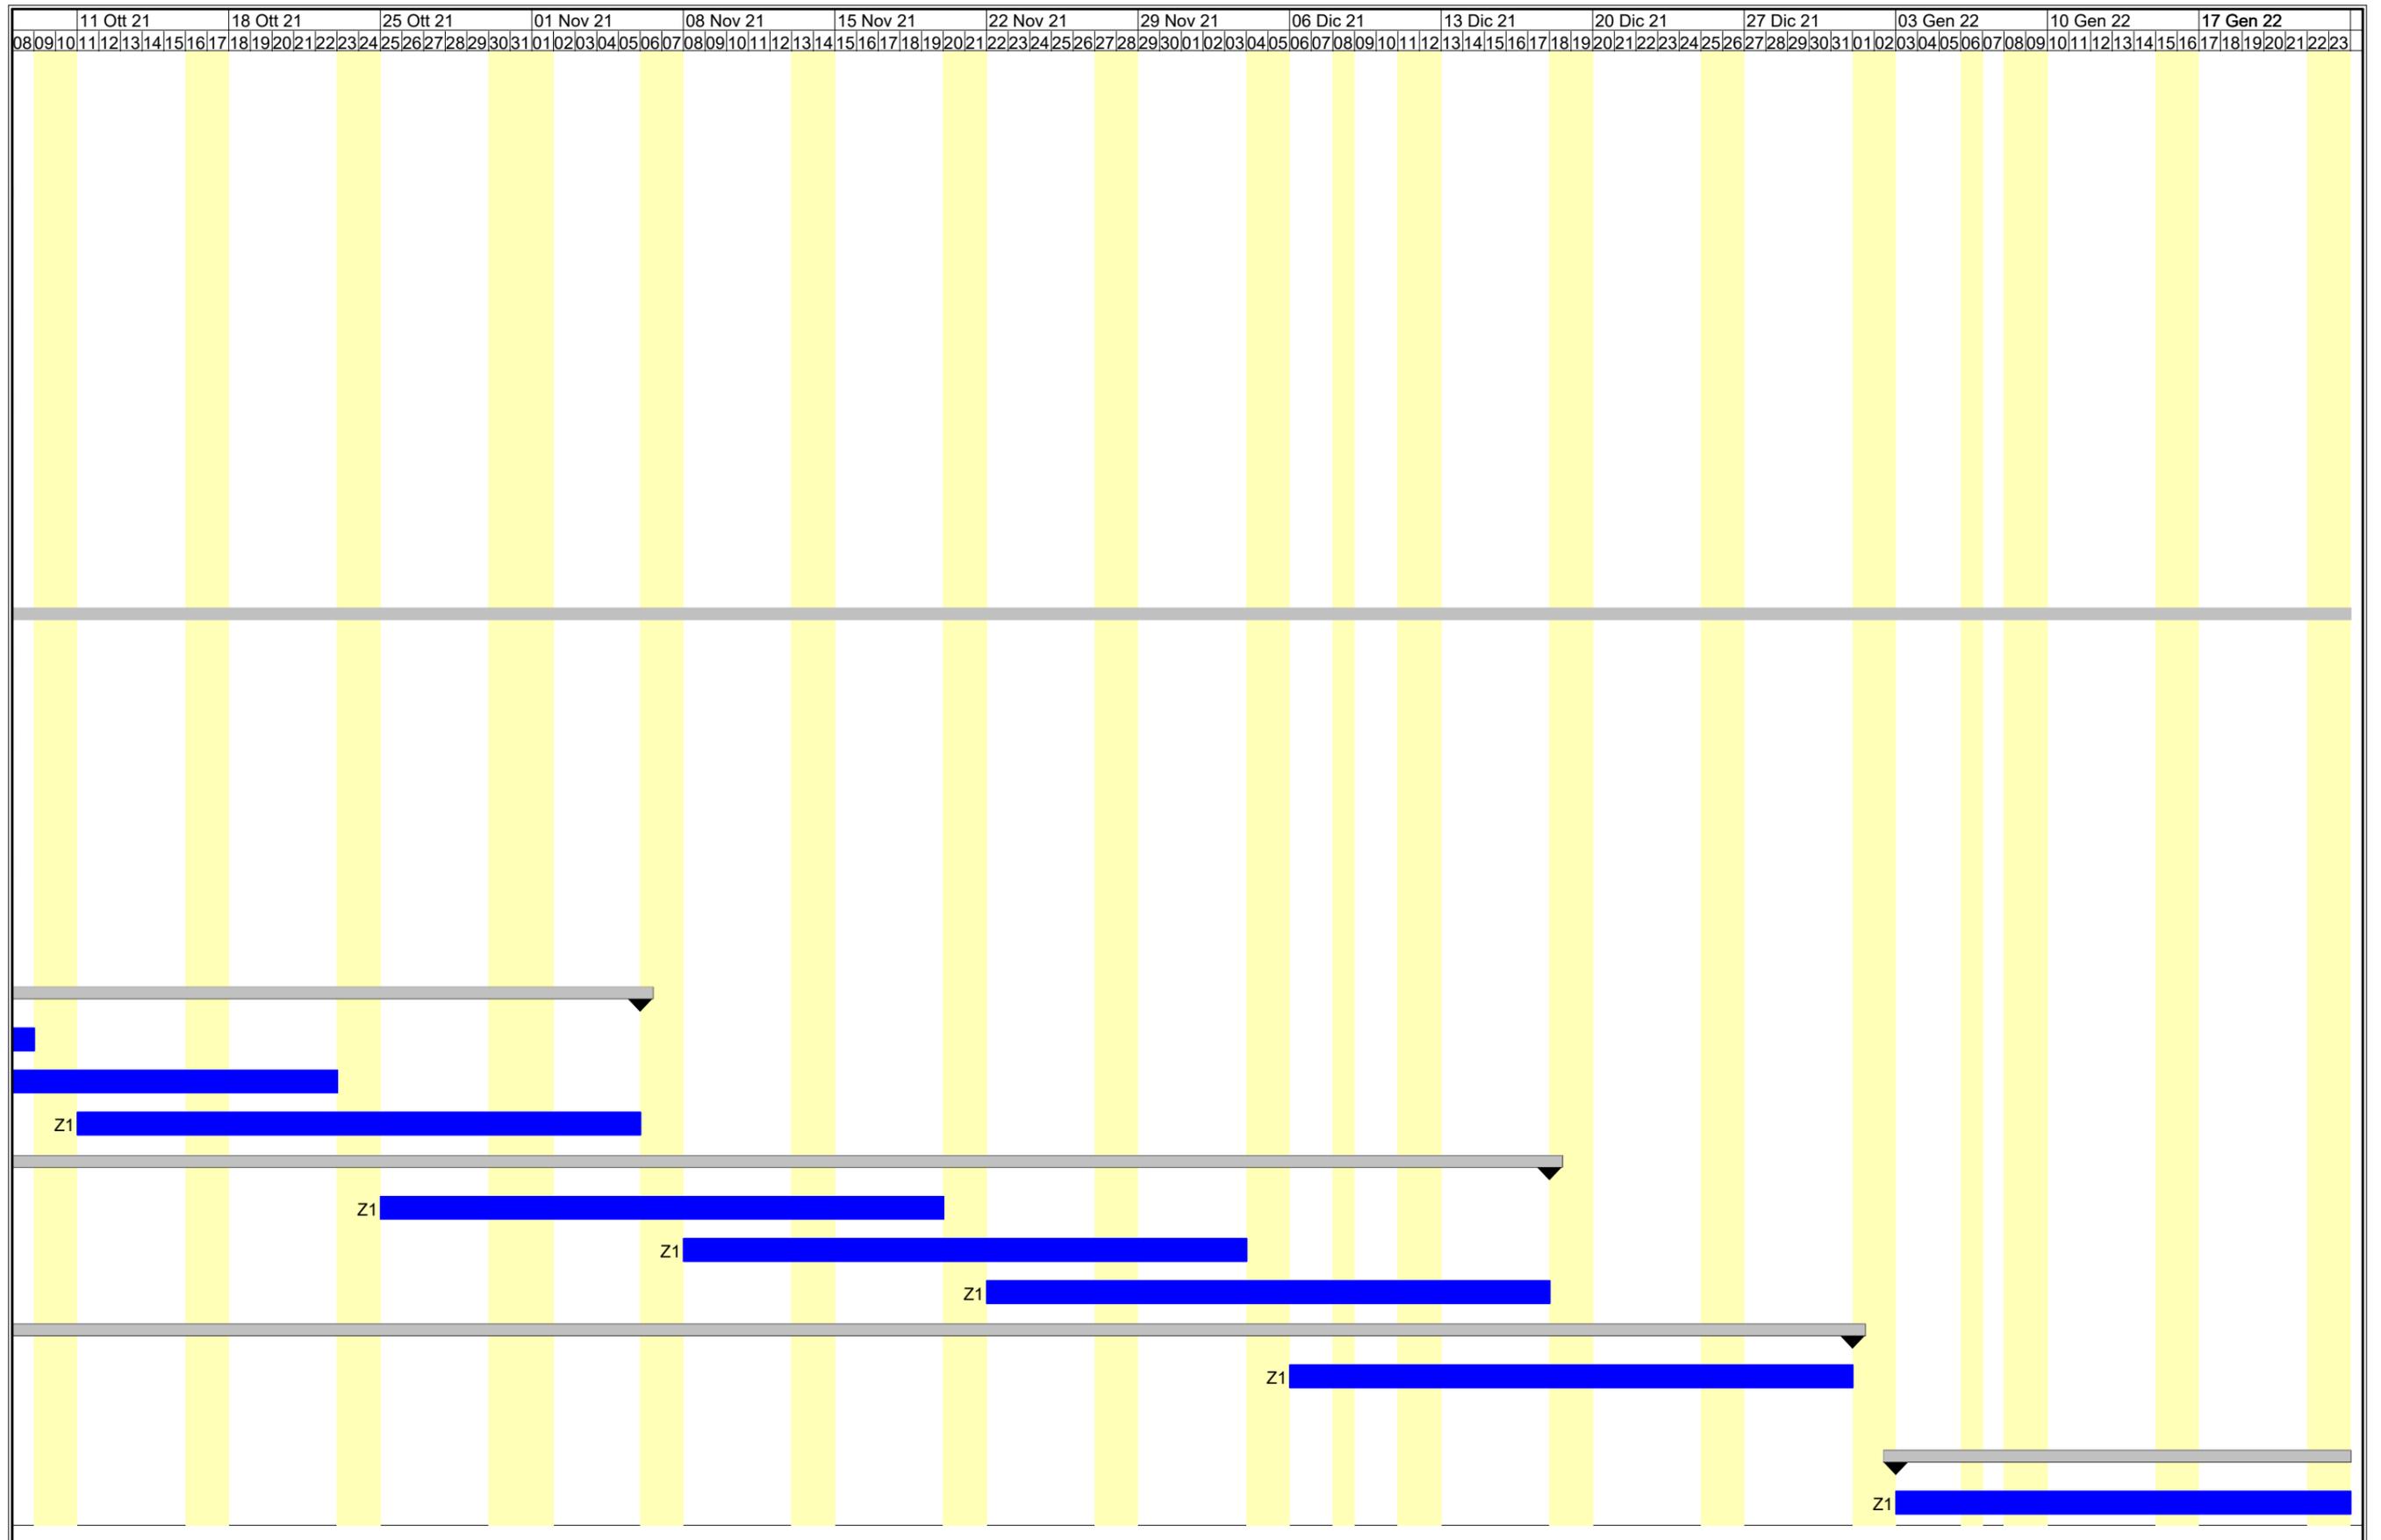

11 Ott 21			18 Ott 21			25 Ott 21			01 Nov 21			08 Nov 21			15 Nov 21			22 Nov 21			29 Nov 21			06 Dic 21			13 Dic 21			20 Dic 21			27 Dic 21			03 Gen 22			10 Gen 22			17 Gen 22				
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																							Z1																							

24 Gen 22			31 Gen 22			07 Feb 22			14 Feb 22			21 Feb 22			28 Feb 22			07 Mar 22			14 Mar 22			21 Mar 22			28 Mar 22			04 Apr 22			11 Apr 22			18 Apr 22			25 Apr 22			02 Mag 22			09 Mag 22																																		
24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

24 Gen 22			31 Gen 22			07 Feb 22			14 Feb 22			21 Feb 22			28 Feb 22			07 Mar 22			14 Mar 22			21 Mar 22			28 Mar 22			04 Apr 22			11 Apr 22			18 Apr 22			25 Apr 22			02 Mag 22			09 Mag 22																																		
24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

24 Gen 22			31 Gen 22			07 Feb 22			14 Feb 22			21 Feb 22			28 Feb 22			07 Mar 22			14 Mar 22			21 Mar 22			28 Mar 22			04 Apr 22			11 Apr 22			18 Apr 22			25 Apr 22			02 Mag 22			09 Mag 22																																		
24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

